

Tuluá, octubre 30 de 2016

Señores:

INFITULUÁ E.I.C.E.

Atte. Diana Lorena Viveros Cortez

Prof. Administrativo.

Calle 21 No. 38-77

Tuluá Valle del Cauca

Asunto: Remisión documental del seguimiento a **MANTENIMIENTO Y REMODELACION**
PABELLON DE CARNES DE TULUA.


Cordial saludo,

Dando cumplimiento al objeto del contrato de prestación de servicios No. 400-16-1.080, seguimiento a la obra de mantenimiento y remodelación pabellón de carnes, contrato de suministro de mano de obra y equipos No. 400-16-6.002 presento los siguientes documentos soporte de la ejecución de obra.

- ✓ Informe de actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre 15 de octubre y 30 de octubre por parte del contratista.
- ✓ Cronograma general con avance de obra ejecutada.
- ✓ Cuadro de cantidad de obra ejecutada con su respectivo soporte y registro fotográfico.
- ✓ Registro de afiliación y pago a seguridad social del personal que labora en la obra.

Sin otro Particular, dispuesto a aclarar cualquier inquietud.

Atentamente,



Arq. Edward Lores Quintero

C.c. 16.366.935

No. CONTRATO	400-16-6.002	PERIODO DE RENDICIÓN	15 de OCTUBRE	A	30 de OCTUBRE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NELSON BEDOYA MORALES				
SUPERVISOR	Arq. RODOLFO RAMIREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES		RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES		
A. Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas y las cantidades de obra que hacen parte del mismo. B. A efectuar su trabajo con el máximo de rapidez, eficiencia, responsabilidad personal y profesional. C. Para garantizar el presente contrato el CONTRATISTA constituirá a favor de INIFITULUÁ E.I.C.E- CONTRATANTE una garantía para avalar el cumplimiento del CONTRATO y sus obligaciones vigentes durante el tiempo de ejecución del CONTRATO y su liquidación debiendo amparar las siguientes GARANTÍAS: De conformidad con el	-Coordinación y ejecución trabajos de estructurado, instalación lamina board y acabado de muros y cielo falso en locales, sector sur y oriente. -Coordinación y ejecución trabajos de mantenimiento y protección de cubierta sector oriente y sur.		-Se realizan los últimos trabajos de estructuración de muros divisorios y cielo falso, se instala lamina board y se da acabado a estos cielos falsos incluyendo pintura de los sectores oriente y sur. -Se aplicó material protector en los elementos de madera (cerchas y correas) para evitar deterioro por humedad o ataque por insectos. Se ejecutan los trabajos de ampliación de cubierta armando la estructura de cubierta sobre los locales del sector sur lado norte que dan hacia el patio, se coloca la cañabrava se instala la teja de barro		

artículo 5 literal D del manual De contratación de Infituluá E.I.C.E en calidad de contratante requerirán constituir las siguientes: a) De cumplimiento por el 10% del valor total hasta la liquidación del contrato;b) amparo de calidad del servicio contratado por una suma equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia contada a partir de la firma del acta de iniciación de actividades, por el termino de duración del mismo y cuatro meses más.

-Adecuación muros y columnas sector sur y oriente.

-Terminado de piso en concreto guarda escoba sector sur.

-Ejecución de trabajos red hidráulica y eléctrica.

-Ejecutar adecuaciones y mantenimiento general en pabellón de carnes y plaza de mercado.

-Continua los trabajos de estuco en columnas del sector sur y oriente, se detalla estucos en muro de estos sectores.

-Continua la construcción del guarda escoba en media caña en los locales del sector sur.

-Se hacen trabajos finales en la red hidráulica principal para independizar circuitos y mejorar funcionamiento.

-Se hace el montaje de los circuitos de iluminación y tomas de los sectores oriente y sur.


-En el pabellón de carnes se adecuan red hidrosanitaria en locales sector sur lado norte frente al patio del sector. En el patio de hierbas se desmonta cielo falso y se retiran escombros de este y otros locales aledaños.

En área de desposte y cuarto frío se hacen adecuaciones en pozuelo y bajo mesón, se hace demarcaciones en estas zonas.

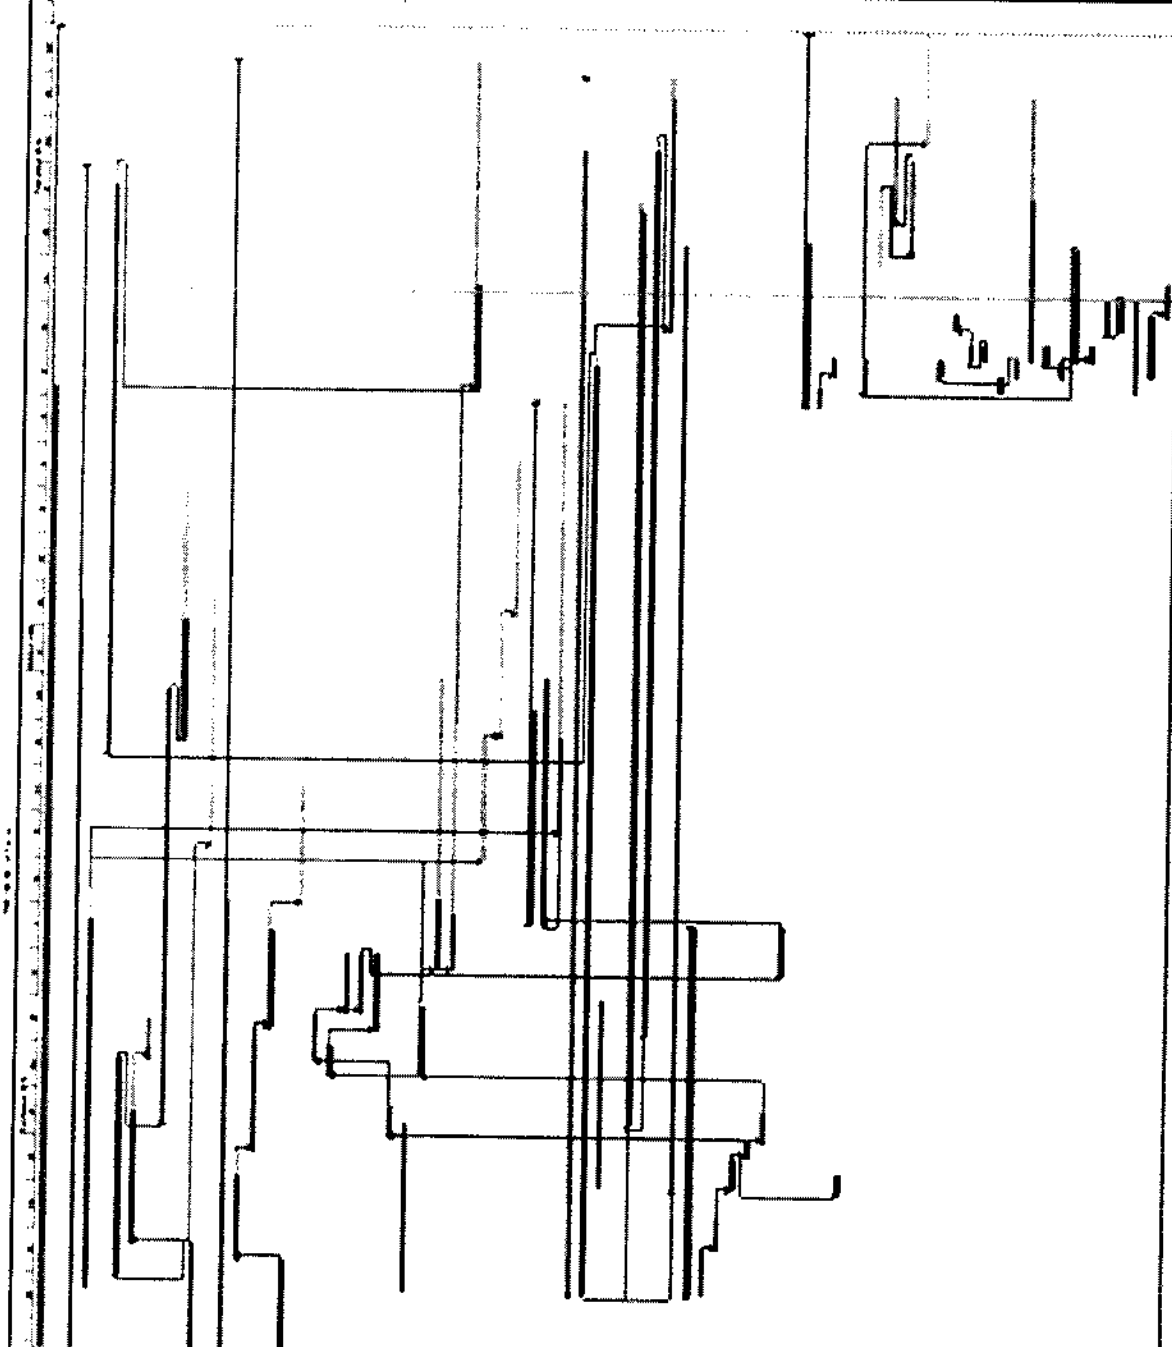
En la Plaza de mercado se realiza mantenimiento de cubierta, tanto de teja de barro como de fibrocemento, se adecua sitio haciendo el cerramiento en ladrillo

 INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02 Fecha de aprob: 31/MAR/2010 Página: 3 de 3

		para futuro local. Se hace mantenimiento de la red hidráulica arreglando daños en tubería y cambiando las llaves terminales en mal estado.		
			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS		10	83
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos ó negativos)				
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)		Se anexa soporte de las cantidades ejecutadas y registro fotográfico.		

FIRMA: 

Nelson Bedoya Morales
C.C. 16.255.886 de Calarcá



LINE	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	RESISTOR 10K	10K	1	
2	RESISTOR 10K	10K	1	
3	RESISTOR 10K	10K	1	
4	RESISTOR 10K	10K	1	
5	RESISTOR 10K	10K	1	
6	RESISTOR 10K	10K	1	
7	RESISTOR 10K	10K	1	
8	RESISTOR 10K	10K	1	
9	RESISTOR 10K	10K	1	
10	RESISTOR 10K	10K	1	
11	RESISTOR 10K	10K	1	
12	RESISTOR 10K	10K	1	
13	RESISTOR 10K	10K	1	
14	RESISTOR 10K	10K	1	
15	RESISTOR 10K	10K	1	
16	RESISTOR 10K	10K	1	
17	RESISTOR 10K	10K	1	
18	RESISTOR 10K	10K	1	
19	RESISTOR 10K	10K	1	
20	RESISTOR 10K	10K	1	
21	RESISTOR 10K	10K	1	
22	RESISTOR 10K	10K	1	
23	RESISTOR 10K	10K	1	
24	RESISTOR 10K	10K	1	
25	RESISTOR 10K	10K	1	
26	RESISTOR 10K	10K	1	
27	RESISTOR 10K	10K	1	
28	RESISTOR 10K	10K	1	
29	RESISTOR 10K	10K	1	
30	RESISTOR 10K	10K	1	
31	RESISTOR 10K	10K	1	
32	RESISTOR 10K	10K	1	
33	RESISTOR 10K	10K	1	
34	RESISTOR 10K	10K	1	
35	RESISTOR 10K	10K	1	
36	RESISTOR 10K	10K	1	
37	RESISTOR 10K	10K	1	
38	RESISTOR 10K	10K	1	
39	RESISTOR 10K	10K	1	
40	RESISTOR 10K	10K	1	
41	RESISTOR 10K	10K	1	
42	RESISTOR 10K	10K	1	
43	RESISTOR 10K	10K	1	
44	RESISTOR 10K	10K	1	
45	RESISTOR 10K	10K	1	
46	RESISTOR 10K	10K	1	
47	RESISTOR 10K	10K	1	
48	RESISTOR 10K	10K	1	
49	RESISTOR 10K	10K	1	
50	RESISTOR 10K	10K	1	
51	RESISTOR 10K	10K	1	
52	RESISTOR 10K	10K	1	
53	RESISTOR 10K	10K	1	
54	RESISTOR 10K	10K	1	
55	RESISTOR 10K	10K	1	
56	RESISTOR 10K	10K	1	
57	RESISTOR 10K	10K	1	
58	RESISTOR 10K	10K	1	
59	RESISTOR 10K	10K	1	
60	RESISTOR 10K	10K	1	
61	RESISTOR 10K	10K	1	
62	RESISTOR 10K	10K	1	
63	RESISTOR 10K	10K	1	
64	RESISTOR 10K	10K	1	
65	RESISTOR 10K	10K	1	
66	RESISTOR 10K	10K	1	
67	RESISTOR 10K	10K	1	
68	RESISTOR 10K	10K	1	
69	RESISTOR 10K	10K	1	
70	RESISTOR 10K	10K	1	
71	RESISTOR 10K	10K	1	
72	RESISTOR 10K	10K	1	
73	RESISTOR 10K	10K	1	
74	RESISTOR 10K	10K	1	
75	RESISTOR 10K	10K	1	
76	RESISTOR 10K	10K	1	
77	RESISTOR 10K	10K	1	
78	RESISTOR 10K	10K	1	
79	RESISTOR 10K	10K	1	
80	RESISTOR 10K	10K	1	
81	RESISTOR 10K	10K	1	
82	RESISTOR 10K	10K	1	
83	RESISTOR 10K	10K	1	
84	RESISTOR 10K	10K	1	
85	RESISTOR 10K	10K	1	
86	RESISTOR 10K	10K	1	
87	RESISTOR 10K	10K	1	
88	RESISTOR 10K	10K	1	
89	RESISTOR 10K	10K	1	
90	RESISTOR 10K	10K	1	
91	RESISTOR 10K	10K	1	
92	RESISTOR 10K	10K	1	
93	RESISTOR 10K	10K	1	
94	RESISTOR 10K	10K	1	
95	RESISTOR 10K	10K	1	
96	RESISTOR 10K	10K	1	
97	RESISTOR 10K	10K	1	
98	RESISTOR 10K	10K	1	
99	RESISTOR 10K	10K	1	
100	RESISTOR 10K	10K	1	

REMODELACION PABELLON DE CARNES TULUA VALLE



CONTRATO DE MANO DE OBRA No 400-16-002			PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: SESENTA (60) DIAS ADICION DE CUARENTA (40) DIAS	
OBJETO	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUA. Para la realizacion de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos	CONTRATISTA: NELSON REDOYA NIT. No 16.255.888	VALOR DEL CONTRATO: \$ 60,000,000.00 ADICION \$ 20,632.744,85	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 400-16-1.000			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE TERMINACION: 05 DE DICIEMBRE DE 2016	
OBJETO	SUPLIMIENTO DE LA OBRA "REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUA. Para la realizacion de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos."	Arc EDWARD LONES QUINTERO		

CONDICIONES ACTUALES					ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ELABORADO ACTA E ACTUAL		ELABORADO ANTERIOR		ELABORADO ACTUAL
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1 CERRAMIENTO Y ACABADOS											
1-1	MUROS BOARD	m2	234.19	22,137.50	5,184,781.13	91.97	2,026,985.88	92.09	2,057,754.88	184.02	4,073,742.75
1-2	C.E. OS BOARD	m2	433.55	9,058.00	3,925,935.90	267.19	2,426,207.02	99.02	866,691.16	366.21	3,292,898.18
1-3	REFLEJO SOBRE MURO	m2	88.25	8,352.20	739,431.65	88.50	721,459.70	-	-	88.50	721,459.70
1-4	ESTUCCO SOBRE COLUMNAS	m2	474.00	2,310.00	1,094,940.00	254.68	588,333.90	88.61	200,009.10	342.30	788,463.00
1-5	PINTURA COLUMNAS	m2	158.00	3,465.00	547,320.00	36.00	174,740.00	-	-	36.00	174,740.00
1-6	ESTUCCO SOBRE MUROS	m2	351.76	3,080.00	1,083,396.00	200.27	603,077.60	65.89	202,941.20	346.11	1,066,318.80
1-7	PINTURA MUROS	m2	662.30	2,465.00	1,642,869.50	327.25	1,133,921.25	-	-	327.25	1,133,921.25
1-8	ASOS. 1/2" FADA MUROS	m2	403.50	962.50	388,368.75	455.40	438,312.50	-	-	455.40	438,312.50
1-9	REFINITE MURO	m2	389.52	1,347.50	524,878.20	-	-	-	-	389.52	524,878.20
SUBTOTAL CERRAMIENTO Y ACABADOS					15,824,321.13	-	8,326,637.84	-	3,901,469.34	-	12,228,107.18
2 RED SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA											
2-1-1	RED HIDRAULICA PRINCIPAL PVC 1"	ml	103.00	774.00	79,722.00	47.00	36,378.00	-	-	47.00	36,378.00
2-1-2	TUBERIA HIDRAULICA PVC 1/2"	ml	93.50	270.00	25,245.00	71.70	19,359.00	-	-	71.70	19,359.00
2-1-3	PUNTO HIDRAULICO	pto	41.00	19,250.00	789,250.00	16.00	308,000.00	-	-	16.00	308,000.00
2-1-4	REGATA MURO	ml	58.14	1,313.80	76,824.86	63.70	86,364.46	-	-	63.70	86,364.46
2-1-5	MEDIDOR AGUA	und	17.00	13,298.00	226,066.00	-	-	-	-	-	-
2-1-6	TUBERIA SANITARIA 2" 7"	ml	18.00	7,700.00	138,600.00	13.30	102,410.00	-	-	13.30	102,410.00
2-1-7	TUBERIA SANITARIA 1 1/2"	ml	12.00	2,379.25	27,951.00	14.00	32,609.50	-	-	14.00	32,609.50
2-1-8	PUNTO SANITARIO 2"	pto	15.00	10,638.40	159,576.00	9.00	95,745.60	-	-	9.00	95,745.60
2-1-9	PUNTO SANITARIO 1 1/2"	pto	3.00	21,276.80	63,830.40	3.00	63,830.40	-	-	3.00	63,830.40
2-2	CAJA DE INSPECCION	und	2.00	92,061.15	184,122.30	2.00	184,122.30	-	-	2.00	184,122.30
2-2-1	TRAMPA DE GRASAS	und	3.00	17,348.00	52,047.00	3.00	52,047.00	-	-	3.00	52,047.00
2-2-2	RED ELECTRICA PRINCIPAL ENT	ml	129.00	5,579.86	719,801.94	129.00	719,801.94	-	-	129.00	719,801.94
2-2-3	PUNTO ELECTRICO 10MM	pto	86.00	27,899.30	2,400,138.40	15.00	446,338.50	-	-	15.00	446,338.50
2-2-4	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	pto	71.00	27,899.30	1,980,850.30	15.00	446,338.50	-	-	15.00	446,338.50
2-2-5	PUNTO ELECTRICO 10MM	pto	71.00	27,899.30	1,980,850.30	15.00	446,338.50	-	-	15.00	446,338.50
2-2-6	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	pto	71.00	27,899.30	1,980,850.30	15.00	446,338.50	-	-	15.00	446,338.50
2-3	CONTADOR ENERGIA	und	17.00	68,042.00	1,173,714.00	-	-	-	-	-	-
2-3-1	CAJA BREAKER	und	19.00	25,363.00	481,897.00	-	-	-	-	-	-
2-3-2	BREAKERS	und	52.00	12,681.50	659,482.00	4.00	50,736.00	-	-	4.00	50,736.00
SUBTOTAL RED SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA					10,462,727.63	-	3,006,407.06	-	2,980,507.84	-	5,986,914.90
3 CUBIERTAS											
3-1	DESTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	687.50	29,891.40	20,500,317.50	566.00	16,918,532.40	121.35	3,627,323.39	687.35	20,545,853.79
3-2	IMPRESIONIZACION CANAL FACHADA ORA 22	ml	45.00	15,116.00	680,730.00	45.00	680,730.00	-	-	45.00	680,730.00
3-3	CANAL CANA BARRA	m2	532.00	6,340.50	3,373,766.00	350.00	2,185,210.00	-	-	350.00	2,185,210.00
3-4	RECORRIDO CUBIERTA	m2	1,321.00	2,688.50	3,551,641.00	671.00	1,804,050.60	1,131.10	3,041,075.44	3,882.10	10,430,126.04
3-5	ASIENTO DE ESCOMBROS	m3	24.00	3,050.55	73,213.20	25.70	76,873.86	-	-	25.70	76,873.86
3-6	PROTECCION ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ml	3,508.00	2,036.40	7,143,707.20	1,903.12	3,879,313.81	613.60	1,246,685.44	2,516.72	5,125,999.25
SUBTOTAL CUBIERTA					36,146,283.24	-	28,713,296.87	-	8,686,848.48	-	37,399,145.35
4 PISOS											
4-1	PISO CONCRETO	m2	208.16	12,681.20	2,639,718.59	195.32	2,476,891.98	-	-	195.32	2,476,891.98
4-2	QUADRALES CEMENTA MEJA CANA	ml	436.10	5,434.80	2,379,116.28	-	-	-	-	436.10	2,379,116.28
SUBTOTAL PISOS					5,018,834.87	-	2,476,891.98	-	-	-	2,476,891.98
5 VARIOS											
5-1	DEMOLICION MESONES Y APUELO	m2	21.00	13,558.00	284,718.00	23.10	313,195.80	-	-	23.10	313,195.80
5-2	DEMOLICION MISO	m2	21.90	2,023.70	44,319.03	22.05	44,643.28	-	-	22.05	44,643.28
5-3	DEMOLICION CONTRAPISO	m2	20.00	3,389.50	67,790.00	19.90	67,451.05	-	-	19.90	67,451.05
5-4	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	2.53	3,050.55	7,716.90	9.55	29,149.01	-	-	9.55	29,149.01
5-5	RETIRO MATERIAL DE SITO	m3	18.74	6,101.10	114,334.61	7.98	45,026.12	-	-	7.98	45,026.12
SUBTOTAL VARIOS					487,657.48	-	489,465.06	-	-	-	489,465.06
6 ITEM NO PREVISTOS											
6-1	DESMONTE LAMINA BOARD	m2	57.35	6,101.00	349,712.75	-	-	23.96	133,977.96	23.96	133,977.96
6-2	INSTALACION LAMINA BOARD	m2	57.35	10,588.00	605,451.60	-	-	23.96	222,512.48	23.96	222,512.48
6-3	EXCAVACION MANUAL	m3	9.23	10,168.00	93,851.56	-	-	7.90	80,335.10	7.90	80,335.10
6-4	INSTALACION CAJA DE BARRIO NORMAL	m2	55.90	9,058.00	505,418.20	-	-	-	-	-	-
6-5	CORTA PISO EN CONCRETO	ml	57.10	3,500.00	200,057.00	-	-	-	-	-	-
6-6	PINTURA EPONICA	m2	385.90	3,450.00	1,332,465.00	-	-	-	-	-	-
6-7	RESANE PISO EN CONCRETO	m2	467.00	700.00	326,900.00	-	-	-	-	-	-
6-8	INSTALACION CANAL METALICA	ml	92.00	2,712.00	249,504.00	-	-	-	-	-	-
6-9	MOVIMIENTO DE ESCOMBROS (para Hobbies)	m3	9.00	6,745.00	60,705.00	-	-	4.44	21,067.80	4.44	21,067.80
6-10	LINIA DE DEMARCACION	ml	15.50	285.00	4,417.50	-	-	13.40	3,872.80	13.40	3,872.80
6-11	RESEAL Y PINTURA PIZOLE	ml	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00
6-12	RETIRO PEGAJA Y RESANE	ml	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00
6-13	DEMOLITE MESON EN MADERA	und	2.70	4,811.00	13,000.00	-	-	-	-	-	-
6-14	DEMOLITE DELO TALSO (para Hobbies)	m2	5.00	3,734.00	18,670.00	-	-	5.51	31,776.54	5.51	31,776.54
6-15	ASFO GENERAL	m2	400.00	1,695.00	678,000.00	-	-	240.00	405,600.00	240.00	405,600.00
6-16	ARREGLO CARMELITE TIJA DE BARRIO	und	6.00	3,823.00	22,938.00	-	-	6.00	22,938.00	6.00	22,938.00
6-17	CAMARAJE TIJA DE BARRIO	und	10.00	3,823.00	38,230.00	-	-	4.00	15,292.00	4.00	15,292.00
6-18	RECORRIDO DE CUBIERTA TIJA DE BARRIO	m2	116.00	2,688.50	311,846.00	-	-	40.00	107,540.00	40.00	107,540.00
6-19	RECORRIDO DE CUBIERTA TIJA DE BARRIO	m2	10.00	3,823.00	38,230.00	-	-	13.86	52,814.78	13.86	52,814.78
6-20	RECORRIDO DE CUBIERTA TIJA DE BARRIO	m2	4.00	3,823.00	15,292.00	-	-	4.00	15,292.00	4.00	15,292.00
6-21	ARREGLO PUNTO HIDRAULICO 1/2"	und	2.00	19,250.00	38,500.00	-	-	2.00	38,500.00	2.00	38,500.00
6-22	PINTURA DE ACEITE SOBRE TIRAS DE BARRA	m2	21.40	5,960.00	127,564.00	-	-	16.65	89,743.50	16.65	89,743.50
6-23	PEGA LADRELO COMUN	m2	10.20	9,801.00	100,000.00	-	-	10.15	97,450.15	10.15	97,450.15
6-24	PINTURA SOBRE MURO (CAL)	m2	35.38	2,888.00	102,000.00	-	-	30.90	14,616.40	30.90	14,616.40
SUBTOTAL VARIOS					-	-	1,434,884.11	-	1,434,884.11	-	1,434,884.11
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					66,332,834.36	-	40,066,331.84	-	12,687,483.79	-	52,753,715.63
COSTOS INDIRECTOS					-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					66,332,834.36	-	40,066,331.84	-	12,687,483.79	-	52,753,715.63
EQUIPOS					0.00758	-	3,500,322.47	-	1,132,197.66	-	4,632,520.13
TOTAL COSTOS DIRECTOS					66,332,834.36	-	43,566,654.31	-	13,819,681.45	-	57,386,335.76
EQUIPOS					0.11007	-	-	-	158,265.23	-	158,265.23
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					76,303,660.37	-	43,566,654.31	-	13,977,946.68	-	57,544,600.99
COSTO TOTAL					-	-	15,686,750.78	-	15,686,750.78	-	15,686,750.78

Nelson Redoya
NELSON REDOYA
CONTRATISTA
16255886P

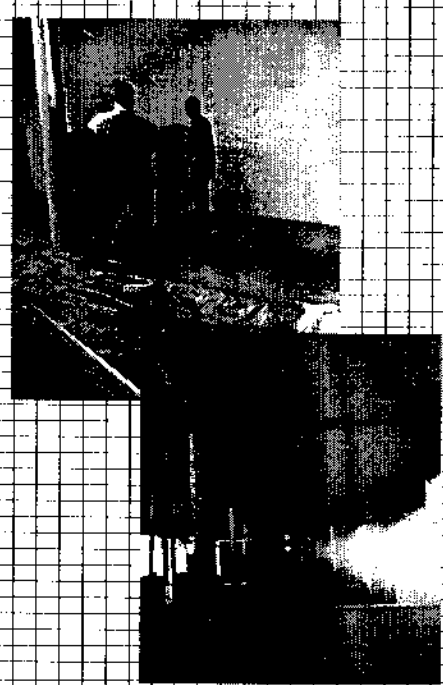
Arc: RODOLFO RAMIREZ
INITULUA

Edward Lones Quintero
Arc: EDWARD LONES QUINTERO
SEGUIMIENTO

PRECTAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DÍA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO		30	10	2016

ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	MUROS BOARD				UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	1-1
-----------------------------	-------------	--	--	--	--------	----	-------------	-----

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO			
SECTOR SUR LADO SUR	24.40	2.00	1.22	10.00	\$ 22,137.50	\$ 540,155.0
SECTOR SUR LADO NORTE	15.37	1.80	1.22	7.00	\$ 22,137.50	\$ 340,253.4
SECTOR SUR LADO NORTE	2.88	2.40	0.40	3.00	\$ 22,137.50	\$ 63,756.0
SECTOR SUR LADO NORTE	5.34	2.19	1.22	2.00	\$ 22,137.50	\$ 118,214.3
SECTOR SUR LADO NORTE	13.97	2.29	1.22	5.00	\$ 22,137.50	\$ 309,260.9
SECTOR ORIENTE LADO SUR-ORIENTE	11.03	2.26	1.22	4.00	\$ 22,137.50	\$ 244,176.6
SECTOR ORIENTE LADO SUR-ORIENTE	1.83	1.50	1.22	1.00	\$ 22,137.50	\$ 40,511.8
SECTOR OCCIDENTE LADO SUR-OCCIDENTE	14.33	2.42	1.48	4.00	\$ 22,137.50	\$ 317,230.4
SECTOR OCCIDENTE LADO SUR-OCCIDENTE	11.41	1.87	1.22	5.00	\$ 22,137.50	\$ 252,568.0
SECTOR OCCIDENTE LADO SUR-OCCIDENTE	12.51	2.05	1.22	5.00	\$ 22,137.50	\$ 276,940.1
SECTOR ORIENTE LADO NOR-ORIENTE	11.03	2.26	1.22	4.00	\$ 22,137.50	\$ 244,176.6
SECTOR ORIENTE LADO NOR-ORIENTE	1.81	1.48	1.22	1.00	\$ 22,137.50	\$ 40,068.9
SECTOR ORIENTE LADO NOR-OCCIDENTE	12.38	2.03	1.22	5.00	\$ 22,137.50	\$ 274,062.3
SECTOR ORIENTE LADO NOR-OCCIDENTE	14.78	1.50	2.46	4.00	\$ 22,137.50	\$ 326,749.5
SECTOR ORIENTE LADO NOR-OCCIDENTE	11.53	1.69	1.22	5.00	\$ 22,137.50	\$ 255,245.4
SECTOR NORTE LADO SUR	13.42	2.20	1.22	5.00	\$ 22,137.50	\$ 297,085.3
SECTOR NORTE LADO SUR	5.05	2.07	1.22	2.00	\$ 22,137.50	\$ 111,794.4
	0.00				\$ 22,137.50	\$ -
	0.00				\$ 22,137.50	\$ -
Pagado a la fecha	-91.00	91.00	1.00	-1.00	\$ 22,137.50	\$ (2,014,512.5)
	0.00				\$ 22,137.50	\$ -
TOTAL	92.05					2037756.88



NELSON BEDOYA
CONTRATISTA DE OBRAS

Nelson Bedoya
16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO


INIFITULUA

PRECIOS DE OBRAS		INITULUA		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO		
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		30	10	2016		
SEGUIMIENTO		ARQ. EDUARDO LORES QUINTERO						
ITEM - ACTIVIDAD - CAPTULO	CIELOS BOARD				UNIDAD	m2	COIGO ITEM	1-2
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VR. PARCIAL	VR. TOTAL		
		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD				
SECTOR SUR LADO SUR	70.50	3.00	2.35	10.00	\$ 9,058.00	\$ 905,800.0		
SECTOR SUR LADO SUR	7.52	3.20	2.35	1.00	\$ 2,310.00	\$ 17,371.2		
SECTOR SUR LADO NORTE	7.18	3.12	2.30	1.00	\$ 9,058.00	\$ 65,036.4		
SECTOR SUR LADO NORTE	27.14	2.95	2.30	4.00	\$ 9,058.00	\$ 245,834.1		
SECTOR SUR LADO NORTE	7.31	3.18	2.30	1.00	\$ 8,058.00	\$ 66,214.0		
SECTOR SUR LADO NORTE	36.02	2.84	2.29	6.00	\$ 9,058.00	\$ 353,443.2		
SECTOR ORIENTE LADO SUR-ORIENTE	27.12	3.00	2.28	4.00	\$ 9,058.00	\$ 245,853.0		
SECTOR OCCIDENTE LADO SUR-OCCIDENTE	25.57	3.03	2.11	4.00	\$ 9,058.00	\$ 231,613.1		
SECTOR OCCIDENTE LADO SUR-OCCIDENTE	27.72	3.00	2.31	4.00	\$ 9,058.00	\$ 251,067.8		
SECTOR ORIENTE LADO NOR-ORIENTE	28.85	2.97	2.28	4.00	\$ 9,058.00	\$ 243,207.3		
SECTOR ORIENTE LADO NOR-ORIENTE	5.54	2.45	2.28	1.00	\$ 9,058.00	\$ 50,181.3		
SECTOR ORIENTE LADO NOR-OCCIDENTE	23.79	2.93	2.03	4.00	\$ 9,058.00	\$ 215,469.8		
SECTOR ORIENTE LADO NOR-OCCIDENTE	27.75	3.07	2.28	4.00	\$ 9,058.00	\$ 251,358.5		
SECTOR NORTE LADO SUR	39.20	2.87	2.20	6.00	\$ 9,058.00	\$ 365,073.6		
SECTOR NORTE LADO SUR	0.00				\$ 9,058.00	\$ -		
	0.00				\$ 9,058.00	\$ -		
	0.00				\$ 9,058.00	\$ -		
Pagado a la fecha	287.19	287.19	1.00	-1.00	\$ 9,058.00	\$ (2,420,287.0)		
TOTAL	84.92					388848.20		

NELSON BEDOYA
CONTRATISTA DE OBRA
16255886

ARQ. EDUARDO LORES Q
SEGUIMIENTO

INITULUA


PRECIOS DE OBRAS								PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.											
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NERSON BEDOYA NIT. No 16.255.886				DIA		MES		AÑO	
						30		10		2018	
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO									
ITEM ACTIVIDAD - CAPITULO		ESTUCO SOBRE COLUMNAS				UNIDAD		ml		CODIGO ITEM	
										1-4	
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL						
		LONGITUD	CANTIDAD								
SECTOR SUR LADO SUR				\$ 2,310.00	\$ -						
SECTOR SUR LADO NORTE	90.30	12.90	7.00	\$ 2,310.00	\$ 208,593.0						
SECTOR SUR LADO NORTE	8.40	1.20	7.00	\$ 2,310.00	\$ 19,404.0						
SECTOR ORIENTE LADO SUR-OCCIDENTE	88.20	29.40	3.00	\$ 2,310.00	\$ 203,742.0						
SECTOR ORIENTE LADO SUR-OCCIDENTE	49.00	9.80	5.00	\$ 2,310.00	\$ 113,190.0						
SECTOR ORIENTE LADO NOR-OCCIDENTE	7.40	7.40	1.00	\$ 2,310.00	\$ 17,094.0						
SECTOR ORIENTE LADO SUR-OCCIDENTE	98.00	19.60	5.00	\$ 2,310.00	\$ 226,380.0						
	0.00			\$ 2,310.00	\$ -						
PAGADO A LA FECHA	-254.89	254.89	-1.00	\$ 2,310.00	\$ (588,333.9)						
	0.00			\$ 2,310.00	\$ -						
TOTAL	86.81				788403.00						
Observaciones											



 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

JHON ROBERT
 INFITULUA


PRECTAS DE OBRAS		INIFTULUA		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
CONTRATISTA				30	10	2016
SEGUIMIENTO		Arg. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		ESTUCCO SOBRE MUROS		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
1-6						
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VAL. PARCIAL	VAL. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		
LOCALES SECTOR SUR LADO SUR	52.32	43.60	1.20	1.00	\$ 3,080.00	\$ 161,145.6
LOCALES SECTOR SUR LADO SUR	83.55	2.45	3.10	11.00	\$ 3,080.00	\$ 257,334.0
LOCALES SECTOR SUR LADO NORTE	35.87	2.45	2.44	6.00	\$ 3,080.00	\$ 110,479.6
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO SUR-OCCIDENTE	27.80	2.50	1.39	8.00	\$ 3,080.00	\$ 85,624.0
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO SUR-ORIENTE	55.80	18.00	3.10	1.00	\$ 3,080.00	\$ 171,864.0
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO SUR-ORIENTE	19.49	0.57	3.80	9.00	\$ 3,080.00	\$ 60,029.2
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO NOR-OCCIDENTE	6.81	2.45	1.39	2.00	\$ 3,080.00	\$ 20,974.8
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO NOR-ORIENTE	44.98	12.85	3.50	1.00	\$ 3,080.00	\$ 138,538.4
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO NOR-ORIENTE	19.49	0.57	3.80	9.00	\$ 3,080.00	\$ 60,029.2
	0.00				\$ 3,080.00	\$ -
PAGADO A LA FECHA	-280.22	280.22	1.00	-1.00	\$ 3,080.00	\$ (863,077.6)
	0.00				\$ 3,080.00	\$ -
TOTAL	85.89					202841.20
Observaciones						


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886



 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFTULUA

PRECTAS DE OBRAS		 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos. PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO		Arq.EDWARD LORES QUINTERO		30	10	2016
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
				3-1		

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LARGO	ANCHO			
SECTOR ORIENTE	559.65	41.00	13.65	\$ 29,891.40	\$ 16,728,722.0	
SECTOR SUR	72.20	9.50	7.60	\$ 29,891.40	\$ 2,158,159.1	
SECTOR SUR	55.50	18.50	3.00	\$ 29,891.40	\$ 1,658,972.7	
	0.00			\$ 29,891.40	\$ -	
	0.00			\$ 29,891.40	\$ -	
	0.00			\$ 29,891.40	\$ -	
PAGADO A LA FECHA	-566.00	566.00	-1.00	\$ 29,891.40	\$ (16,918,532.4)	
	0.00			\$ 29,891.40	\$ -	
	0.00			\$ 29,891.40	\$ -	
TOTAL	121.35			3627321.39		

Observaciones:


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO


INIFITULUA


PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 18.255.886		DÍA	MES	AÑO
				30	10	2018
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		CAMBIO CAÑA BRAVA		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
						3-3

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO		
SECTOR ORIENTE	489.60	36.00	13.60	\$ 6,340.60	\$ 3,104,357.8
SECTOR SUR	88.00	11.00	8.00	\$ 6,340.60	\$ 557,972.8
SECTOR SUR	55.50	18.50	3.00	\$ 6,340.60	\$ 351,903.3
	0.00			\$ 6,340.60	\$ -
	0.00			\$ 6,340.60	\$ -
	0.00			\$ 6,340.60	\$ -
	0.00			\$ 6,340.60	\$ -
PAGADO A LA FECHA	-350.00	350.00	-1.00	\$ 6,340.60	\$ (2,219,210.0)
	0.00			\$ 6,340.60	\$ -
	0.00			\$ 6,340.60	\$ -
TOTAL	283.10				1796023.86



Observaciones


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
			30	10	2018
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	RECORRIDO CUBIERTA		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
					0.00

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO		
SECTOR ORIENTE	557.50	41.00	13.60	\$ 2.688.60	\$ 1.498.163.4
SECTOR SUR	178.00	22.00	8.00	\$ 2.688.60	\$ 473.193.6
SECTOR SUR	55.50	18.50	3.00	\$ 2.688.60	\$ 149.217.3
SECTOR NORTE	242.00	22.00	11.00	\$ 2.688.60	\$ 650.641.2
PLAZA DE MERCADO	100.00	20.00	5.00	\$ 2.688.60	\$ 268.860.0
	0.00			\$ 2.688.60	\$ -
	0.00			\$ 2.688.60	\$ -
	0.00			\$ 2.688.60	\$ -
	0.00			\$ 2.688.60	\$ -
	0.00			\$ 2.688.60	\$ -
	0.00			\$ 2.688.60	\$ -
	0.00			\$ 2.688.60	\$ -
	0.00			\$ 2.688.60	\$ -
TOTAL	1131.10				3041075.46



Observaciones:


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886

ARQ. EDWARD LORES Q
SEGUIMIENTO

INFITULUA

PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
				30	10	2016
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RETIRO DE ESCOMBROS		UNIDAD	M3	CODIGO ITEM
						0.00
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTURA		
SECTOR ORIENTE	18.00	4.00	3.00	1.50	\$ 3,050.55	\$ 54,909.9
SECTOR SUR	6.00	3.00	2.00	1.00	\$ 3,050.55	\$ 18,303.3
	0.00				\$ 3,050.55	\$ -
	0.00				\$ 3,050.55	\$ -
	24.00				\$ 3,050.55	\$ -
PORCENTAJE DE EXPANSION 30%	7.20				\$ 3,050.55	\$ 21,964.0
	0.00				\$ 3,050.55	\$ -
PAGADO A LA FECHA	-25.20	25.20	1.00	-1.00	\$ 3,050.55	\$ (76,873.9)
	0.00				\$ 3,050.55	\$ -
TOTAL	6.00					18303.30
Observaciones						





 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA 16255886



 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886			DIA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO	Arq.EDWARD LORES QUINTERO			30	10	2016
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	PROTECCION ESTRUCTURA DE CUBIERTA			UNIDAD	ml	CODIGO ITEM
						0.00

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LONGITUD			
SECTOR NORTE	779.52	779.52	\$ 2,038.40	\$ 1,588,973.6	
SECTOR ORIENTE	1146.00	1146.00	\$ 2,038.40	\$ 2,338,006.4	
SECTOR SUR	589.20	589.20	\$ 2,038.40	\$ 1,201,025.3	
	0.00		\$ 2,038.40	\$ -	
	0.00		\$ 2,038.40	\$ -	
PAGADO A LA FECHA	-1903.12	-1903.12	\$ 2,038.40	\$ (3,879,319.8)	
	0.00		\$ 2,038.40	\$ -	
TOTAL	611.60			1246665.44	


Observaciones


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886			DIA	MES
SEGUIMIENTO	Arq.EDWARD LORES QUINTERO			30	10
AÑO		2016			
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	DESMONTE LAMINA BOARD			UNIDAD	m2
				CODIGO ITEM	6-1
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ALTURA		
SECTOR SUR LADO NORTE (PATIO)	21.96	18.00	1.22	\$ 6,101.00	\$ 133,978.0
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
	0.00			\$ 6,101.00	\$ -
TOTAL	21.96				133977.96
					
Observaciones					



 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

IN/ITULUA

PRETAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
			30	10	2016
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	INSTALACION LAMINA BOARD		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
					6-2
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LONGITUD	CANTIDAD		
SECTOR SUR LADO OCCIDENTAL	21.96	18.00	1.22	\$ 10,588.00	\$ 232,512.5
	0.00			\$ 10,588.00	\$ -
	0.00			\$ 10,588.00	\$ -
	0.00			\$ 10,588.00	\$ -
	0.00			\$ 10,588.00	\$ -
	0.00			\$ 10,588.00	\$ -
	0.00			\$ 10,588.00	\$ -
	0.00			\$ 10,588.00	\$ -
TOTAL	21.96				232512.48
Observaciones					


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRETAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO		30	10	2016
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		EXCAVACION MANUAL		UNIDAD	M3	6-3
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTURA		
SECTOR SUR LADO NOROCCIDENTAL	4.45	12.70	0.50	0.70	\$ 10,169.00	\$ 45,252.1
	2.43	27.00	0.30	0.30	\$ 10,169.00	\$ 24,710.7
	0.51	0.80	0.80	0.80	\$ 10,169.00	\$ 5,186.2
	0.51	0.80	0.80	0.80	\$ 10,169.00	\$ 5,186.2
	0.00				\$ 10,169.00	\$ -
	0.00				\$ 10,169.00	\$ -
TOTAL	7.90					80335.10
						
Observaciones						

NELSON BEDOYA
CONTRATISTA DE OBRA

Nelson Bedoya
16255886

ARQ. EDWARD LORES Q
SEGUIMIENTO

Edward Lores

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 REMDELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos. PABELLON DE CARNES TULUA VALLE					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO		
			30	10	2016		
SEGUIMIENTO	Arg. EDWARD LORES QUINTERO						
ITEM - ACTVIDAD - CAPITULO		MOVIMIENTO DE ESCOMBROS (patio Hierbas)		UNIDAD	m3	CODIGO ITEM	6-9
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LONGITUD	ANCHO	ALTO			
PATIO HIERBAS LOCALES 1123	0.84	3.00	2.80	0.10	\$ 4,745.00	\$ 3,985.8	
PATIO HIERBAS LOCALES 1129	1.80	3.00	6.00	0.10	\$ 4,745.00	\$ 8,541.0	
PATIO HIERBAS LOCALES 1130	1.80	3.00	6.00	0.10	\$ 4,745.00	\$ 8,541.0	
	0.00				\$ 4,745.00	\$ -	
	0.00				\$ 4,745.00	\$ -	
	0.00				\$ 4,745.00	\$ -	
	0.00				\$ 4,745.00	\$ -	
	0.00				\$ 4,745.00	\$ -	
TOTAL	4.44					21067.80	
Observaciones							


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886



 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
				30	10	2016
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		LINEA DE DEMARCAACION		UNIDAD	ml	CODIGO ITEM
						6-10

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES LONGITUD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
CUARO DESPOSTAJE	3.80	3.80	\$ 289.00	\$ 1,098.2	 
CUARTO FRIO	9.60	9.60	\$ 289.00	\$ 2,774.4	
	0.00		\$ 289.00	\$ -	
	0.00		\$ 289.00	\$ -	
	0.00		\$ 289.00	\$ -	
	0.00		\$ 289.00	\$ -	
	0.00		\$ 289.00	\$ -	
	0.00		\$ 289.00	\$ -	
TOTAL	13.40			3872.60	

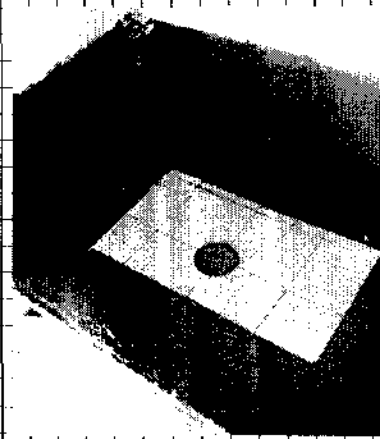
Observaciones


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRETAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE	
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
			30	10	2016
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RESANE Y PINTURA POZUELO		UNIDAD	g
				CODIGO ITEM	6-11


LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES GLOBAL	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
POZUELO CUARTO FRIO	1.00	1.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.0	
	0.00		\$ 10,000.00	\$ -	
	0.00		\$ 10,000.00	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
TOTAL	1.00			10000.00	

Observaciones	
---------------	--


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INFITULUA

PRETAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
				30	10	2016
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RETIRO REJA Y RESANE		UNIDAD	gl	CODIGO ITEM
				6-12		
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES GLOBAL	VR. PARCIAL	VR. TOTAL		
CUARTO DESPOSTE	1.00	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		
	0.00		\$ 20,000.00	\$ -		
	0.00		\$ -	\$ -		
	0.00		\$ -	\$ -		
	0.00		\$ -	\$ -		
	0.00		\$ -	\$ -		
	0.00		\$ -	\$ -		
	0.00		\$ -	\$ -		
	0.00		\$ -	\$ -		
TOTAL	1.00			20000.00		
Observaciones						


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 INIFITULUA Instituto de Fomento Agrario, Agropecuario y Desarrollo de Tierras PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
			30	10	2016
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	DESMONTE MESON EN MADERA		UNIDAD	und	CODIGO ITEM
					6-13

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES LONGITUD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
PLAZA DE MERCADO LOCAL	1.00	1.00	\$ 4,813.00	\$ 4,813.0	
	0.00		\$ 4,813.00	\$ -	
	0.00		\$ 4,813.00	\$ -	
	0.00		\$ 4,813.00	\$ -	
	0.00		\$ 4,813.00	\$ -	
	0.00		\$ 4,813.00	\$ -	
	0.00		\$ 4,813.00	\$ -	
	0.00		\$ 4,813.00	\$ -	
TOTAL	1.00			4813.00	

Observaciones	


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16455886


ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE													
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.															
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886	DIA	MES	AÑO											
		30	10	2016											
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO														
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	DESMONTE CIELO FALSO (patio hierbas)		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	6-14									
LOCALIZACIÓN	TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> <th style="text-align: center;">VR. PARCIAL</th> <th style="text-align: center;">VR. TOTAL</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">LONGITUD</th> <th style="text-align: center;">ANCHO</th> <th style="text-align: center;">ALTO</th> <th></th> <th></th> </tr> </table>			DIMENSIONES			VR. PARCIAL	VR. TOTAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
DIMENSIONES			VR. PARCIAL	VR. TOTAL											
LONGITUD	ANCHO	ALTO													
PATIO DE HIERBAS LOCAL 1129	8.51	2.80	3.04	1.00	\$ 3,734.00	\$ 31,776.3									
	0.00				\$ 3,734.00	\$ -									
	0.00				\$ 3,734.00	\$ -									
	0.00				\$ 3,734.00	\$ -									
	0.00				\$ -	\$ -									
	0.00				\$ -	\$ -									
	0.00				\$ -	\$ -									
	0.00				\$ -	\$ -									
	0.00				\$ -	\$ -									
TOTAL	8.51				31776.34										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Observaciones</td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>							Observaciones								
Observaciones															


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos. PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO		Arq.EDWARD LORES QUINTERO		30	10	2016
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		ASEO GENERAL		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
				6-15		

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LONGITUD	ALTO			
SECTOR SUR	60.00	20.00	3.00	\$ 1,695.00	\$ 101,700.0	
SECTOR ORIENTE	120.00	40.00	3.00	\$ 1,995.00	\$ 203,400.0	
SECTOR NORTE	60.00	20.00	3.00	\$ 1,695.00	\$ 101,700.0	
	0.00			\$ 1,695.00	\$ -	
	0.00			\$ 1,695.00	\$ -	
	0.00			\$ 1,695.00	\$ -	
	0.00			\$ 1,695.00	\$ -	
	0.00			\$ -	\$ -	
TOTAL	240.00				406800.00	


Observaciones	
---------------	--


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886P


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.							
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO	
				30	10	2016	
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO					
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		ARREGLO CABALLETE TEJA DE BARRO		UNIDAD	und	CODIGO ITEM	6-16
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES UNIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL			
PLAZA DE MERCADO SECTOR SAN ANDRESITO	6.00	6.00	\$ 3,623.00	\$ 21,738.0			
	0.00		\$ 3,623.00	\$ -			
	0.00		\$ 3,623.00	\$ -			
	0.00		\$ 3,623.00	\$ -			
	0.00		\$ 3,623.00	\$ -			
	0.00		\$ -				
	0.00		\$ -				
	0.00		\$ -				
TOTAL	6.00			21738.00			
Observaciones							


NELSON BEDOYA
CONTRATISTA DE OBRA
16255886


ARQ. EDWARD LORES Q
SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE	
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
			30	10	2016
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		CAMBIO DE TEJA DE FIBROCEMENTO	UNIDAD	und	CODIGO ITEM
					6-17
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES UNIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
PLAZA DE MERCADO LOCAL 102 103 104 105	4.00	4.00	\$ 3,623.00	\$ 14,492.0	
	0.00		\$ 3,623.00	\$ -	
	0.00		\$ 3,623.00	\$ -	
	0.00		\$ 3,623.00	\$ -	
	0.00		\$ 3,623.00	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
TOTAL	4.00			14492.00	
Observaciones:					


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos. PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
			30	10	2016
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE BARRO	UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
					6-18
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LONGITUD ALTO			
PLAZA DE MERCADO LOCAL 378	20.00	10.00 2.00	\$ 2,688.60	\$ 53,772.0	
PLAZA DE MERCADO LOCAL	20.00	5.00 4.00	\$ 2,688.60	\$ 53,772.0	
	0.00		\$ 2,688.60	\$ -	
	0.00		\$ 2,688.60	\$ -	
	0.00		\$ 2,688.60	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
TOTAL	40.00			107544.00	
Observaciones					


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

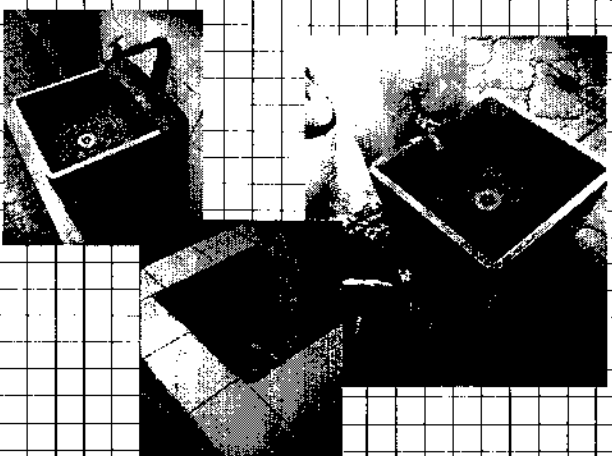
PRECTAS DE OBRAS		 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos. PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
			30	10	2016
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE FIBROCEMENTO		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
					6-19
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VL. PARCIAL	VL. TOTAL
		LONGITUD	ALTO		
PLAZA DE MERCADO LOCAL 2130	3.78	2.70	1.40	\$ 3,623.00	\$ 13,694.9
PLAZA DE MERCADO LOCAL 2131	10.08	7.20	1.40	\$ 3,623.00	\$ 36,519.8
	0.00			\$ 3,623.00	\$ -
	0.00			\$ 3,623.00	\$ -
	0.00			\$ -	\$ -
	0.00			\$ -	\$ -
	0.00			\$ -	\$ -
	0.00			\$ -	\$ -
TOTAL	13.86				50214.78
					
Observaciones:					


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA 16255886



ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
				15	9	2016
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		CAMBIO DE LLAVE TERMINAL		UNIDAD	und	CODIGO ITEM
						6-20

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES UNIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
PLAZA DE MERCADO POZUELO PARQUEADERO MOTOS	1.00	1.00	\$ 3,850.00	\$ 3,850.0	
PLAZA DE MERCADO POZUELO PATIO DE MECATO	1.00	1.00	\$ 3,850.00	\$ 3,850.0	
PLAZA DE MERCADO LOCAL	1.00	1.00	\$ 3,850.00	\$ 3,850.0	
PLAZA DE MERCADO LOCAL	1.00	1.00	\$ 3,850.00	\$ 3,850.0	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -		
	0.00		\$ -		
	0.00		\$ -	\$ -	
TOTAL	4.00			15400.00	


Observaciones


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INFITULUA

PRECTAS DE OBRAS		 PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
			30	10	2016
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM : ACTIVIDAD : CAPITULO	ARREGLO PUNTO HIDRAULICO 1/2"		UNIDAD	ml	CODIGO ITEM
					6-21
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES LONGITUD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
PLAZA DE MERCADO LOCAL ESQUINA SUR SAN ANDRESITOO	1.00	1.00	\$ 19,250.00	\$ 19,250.0	
PABELLON DE CARNES BAÑO	1.00	1.00	\$ 19,250.00	\$ 19,250.0	
	0.00		\$ 19,250.00	\$ -	
	0.00		\$ 19,250.00	\$ -	
	0.00		\$ -	\$ -	
	0.00		\$ -		
	0.00		\$ -		
TOTAL	2.00			38500.00	
Observaciones:					


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA


PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DIA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO		30	10	2016
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		PINTURA DE ACEITE SOBRE TINAS DE BASURA		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM 6-22
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES AREA CANTIDAD		VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
PABELLON DE CARNES	16.85	1.85	9.00	\$ 5,390.00	\$ 89,743.50	
	0.00			\$ 5,390.00	\$ -	
	0.00			\$ 5,390.00	\$ -	
	0.00			\$ 5,390.00	\$ -	
	0.00			\$ 5,390.00	\$ -	
	0.00			\$ 5,390.00	\$ -	
	0.00			\$ 5,390.00	\$ -	
	0.00			\$ -	\$ -	
TOTAL	16.85			\$ 89743.50		
Observaciones						


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

IN ITULUA

PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE	
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NESON BEDOYA NIT. No 16.255.886			DIA	MES
				30	10
SEGUIMIENTO	Arq. EDWARD LORES QUINTERO				AÑO 2016
ITEM - ACTMOAD - CAPITULO	PEGA LADRILLO COMUN			UNIDAD	CODIGO ITEM
				m2	6-23


LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VL. PARCIAL	VL. TOTAL	
		LONGITUD	ALTO			
PLAZA DE MERCADO PATIO MECATO	4.95	5.50	0.90	\$ 9,801.00	\$ 47,525.0	
PLAZA DE MERCADO PATIO MECATO	5.20	2.60	2.00	\$ 9,801.00	\$ 49,925.2	
	0.00			\$ 9,801.00	\$ -	
	0.00			\$ 9,801.00	\$ -	
	0.00			\$ -	\$ -	
	0.00			\$ -		
	0.00			\$ -		
	0.00			\$ -		
TOTAL	10.15				97450.15	

Observaciones:


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INITULUA

PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.886		DÍA	MES	AÑO
SEGUIMIENTO		Arq. EDWARD LORES QUINTERO		30	10	2016
ITEM ACTIVIDAD - CAPITULO			PINTURA SOBRE MURO (CAL)		UNIDAD	CODIGO ITEM
			m2	6-24		
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LONGITUD	ALTO			
PLAZA DE MERCADO PATIO MECATO	9.90	11.00	0.90	\$ 2,888.00	\$ 28,591.2	
PLAZA DE MERCADO PATIO MECATO	10.40	5.20	2.00	\$ 2,888.00	\$ 30,035.2	
	0.00			\$ 2,888.00	\$ -	
	0.00			\$ 2,888.00	\$ -	
	0.00			\$ -	\$ -	
	0.00			\$ -	\$ -	
	0.00			\$ -	\$ -	
	0.00			\$ -	\$ -	
TOTAL	20.30				58626.40	
Observaciones						


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA
 16255886


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SEGUIMIENTO

INIFITULUA

RELACION DE PERSONAL AFILIADO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	EPS	FECHA AFILIACION	ARL	FECHA AFILIACION	FONDO PENSIONES
RAMON DE JESUS ROJAS RAMIREZ	9,993,708	NUEVA EPS	18-08-2017	SURA	19-08-2016	COLFONDOS
LIBARDO DE JESUS GRAJALES BUITRAGO	1,258,932	NUEVA EPS	18-08-2019	SURA	19-08-2016	PENSIONADO
WILMAR AMAYA ALZATE	14,897,438	COOMEVA EPS	20-03-2007	SURA	19-08-2016	COLPENSIONES
NILSON BUENO GUAPACHA	18,599,955	COOMEVA EPS	01-01-2014	SURA	19-08-2016	PORVENIR
FERLEY MOLANO BEDOYA	16,341,068	SOS EPS	28-08-2022	SURA	19-08-2016	PENSIONADO
CARLOS ALBERTO RUIZ OSPINA	16,361,555	NUEVA EPS	2016/09/01	SURA	2016/09/01	
JHON ALEXANDER MONTOYA OSORIO	1,115,080,083	NUEVA EPS	2016/09/01	SURA	2016/09/01	COLFONDOS
JOSE ALEJANDRO OROZCO DURAN	94,356,335	NUEVA EPS	2016/09/21	SURA	2016/09/21	
JOSE ANTONIO VARGAS CHAVARRO	14,796,639	SOS EPS	2016/09/22	SURA	2016/09/21	PORVENIR
NELSON BEDOYA MORALES	16,255,886	SOS EPS		SURA		PENSIONADO

