


 INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02 Fecha de aprob: Página: 2 de 2

No. CONTRATO	400-16-6.004	PERIODO DE RENDICIÓN	Septiembre 30-2016	A	Octubre 13 de 2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DENNYS APOLINAR DELGADO				
INTERVENTOR	RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES		RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES		
1. Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tulúa.	1.1 Mano de obra para la construcción de sardineles en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Conformación y subbase en la Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso;		1.1.1 Se conformó y se instaló la subbase en la vía Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso y se funde la totalidad de la losa y sardineles. Se excava para tubería sumideros y se funden los sumideros. Tulúa. Igualmente en las vías de Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan se construyeron los sardineles en concreto. En la Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela se inicia el cajeo y conformación de la subrasante.		

 INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02 Fecha de aprob: Página: 2 de 2

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	3	21.5	58.85
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	5		
IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos ó negativos)				
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	ANEXOS:			
	2. Registro fotográfico avance de obras en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras de la ciudad de Tuluá. 1- Corte de obra a 13 de octubre-2016. 2- Memorias de cálculo de cantidades ejecutadas. Se entrega un total de evidencia de ____ folios			


FIRMA
DENNYS APOLINAR DELGADO F.
C.C. 94.377.779 CALI

20.16-5 004

-0.51%

CALLE 26E ENTRE CARRERAS 2W Y 3W BARRIO ASDAGRIN FARFAN - VIA No.2					FECHA: 12-oct-16		CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT
1 PRELIMINARES													
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2.495	2.495	1.0	2.495			0.0	\$		
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJED) (SR)	M3	217.9	748	163.001	211.8	158.417			6.1	\$	4.583.15	
1.3	DEMOL. LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1.8	9.355	16.532					1.8	\$	16.531.65	
SUBTOTAL PRELIMINARES					182.027.22	160.912.42						21.114.80	
2 SUBBASE Y RELLENOS													
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	363.2	1.559	566.216	353.0	550.296			10.2	\$	15.920.51	
2.2	SUB-BASE COMP. SELECCI. 10KM CANT. RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	163.4	861	140.719	158.8	136.762			4.6	\$	3.958.64	
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					706.935.07	687.057.92						19.877.15	
3 PAVIMENTO													
3.1	PAV. CONCR. MR=36 E=0.15 INC. JUNTA	M2	363.2	14.184	5.151.515	353.0	5.006.868	10.0	141.840.00	0.2	\$	3.007.01	
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	111.3	833	92.713	59.0	49.147	58.7	48.863.78	-6.4	\$	5.297.88	
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	69.2	312	21.598	163.4	50.978			-94.2	\$	29.380.10	
3.4	SARGINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	133.3	7.196	959.083			132.0	949.872.00	1.3	\$	9.210.88	
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2.0	169.936	339.872			2.0	339.872.00	0.0	\$		
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10.8	9.355	101.034			6.12	57.252.60	4.7	\$	43.781.40	
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9.7	2.495	24.179			23.32	58.171.69	-13.6	\$	33.993.02	
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	12.0	4.581	54.972					12.0	\$	54.972.00	
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1.0	40.531	40.531					1.0	\$	40.531.00	
SUBTOTAL PAVIMENTO					6.745.496.98	5.106.793.62		1.595.872.97				82.831.29	
4 OTROS													
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10.000	10.000					1.0	\$	10.000.00	
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12.474	12.474					1.0	\$	12.474.00	
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PE=UAD 1/2"	UND	1.0	2.500	2.500					1.0	\$	2.500.00	
SUBTOTAL OTROS					24.974.00							0.0	\$
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No. 2					7.699.433.26	5.954.753.97		1.595.872.97				\$ 148.797.23	
										20.73%		1.93%	

CALLE 3A W CON CARRERA 26C6 BARRIO EL DESCANSO - VIA No.3				FECHA: 12-oct-16		CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0	2.495	2.495	1,0	2.495	-	-	0,0	\$
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) (SRI)	M3	152,3	748	113.910	73,1	54.711	-	-	79,1	\$
1.3	DEMOL. LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1,8	9.355	16.532	-	-	-	-	1,8	\$
SUBTOTAL PRELIMINARES					132.936,58	-	57.205,96	-	-	-	75.730,61
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	253,8	1.559	395.690	243,8	380.100	-	-	10,0	\$
2.2	SUB-BASE COMP. SELECCI. 10KM CANT. RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	114,2	861	98.339	-	-	109,7	94.464,18	4,5	\$
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					494.028,47	-	380.099,79	-	94.464,18	-	19.464,50
3 PAVIMENTO											
3.1	PAY. CONCR MR=36 E=0.15, INC. JUNTA	M2	253,8	14.184	3.600.041	-	-	253,8	3.500.041,04	0,0	\$
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	90,3	833	75.220	-	-	81,3	67.897,91	9,0	\$
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa	KLS	55,6	312	17.341	-	-	50,0	15.808,45	5,6	\$
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	113,4	7.196	816.026	-	-	113,4	816.026,40	0,0	\$
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0	169.936	339.872	-	-	2,0	339.872,00	0,0	\$
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8	9.355	101.034	176,8	1.653.758	10,3	96.543,60	-176,3	\$
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7	2.495	24.179	-	-	22,4	55.939,42	-12,7	\$
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	12,0	4.581	54.972	-	-	-	-	12,0	\$
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1,0	40.531	40.531	-	-	-	-	1,0	\$
SUBTOTAL PAVIMENTO					5.069.216,38	-	1.853.758,19	-	4.991.728,82	-	-1.576.270,85
4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0	10.000	10.000	1,0	90.000	45,0	450.000,00	-53,0	\$
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0	12.474	12.474	-	-	-	-	1,0	\$
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0	2.500	2.500	8,0	20.000	-	-	-7,0	\$
										0,0	\$
										0,0	\$
										0,0	\$
SUBTOTAL OTROS					24.974,00	-	110.000,00	-	450.000,00	-	-535.026,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.3					5.721.155,41		\$ 2.201.063,94		\$ 5.536.193,01		\$ 2.016.101,54

96,77%

-35,24%

CALLE 22 ENTRE CARRERA 2 Y 2A BARRIO LAS VERANERAS - VIA No 4				FECHA: 12-oct-16		CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2,495	2,495	1.0	2,495			0.0	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) (SR)	M3	119.4	748	89,311	113.4	84,823			6.0	4,488
1.3	DEMOL. LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1.8	9,355	16,532					1.8	16,532
SUBTOTAL PRELIMINARES					108,337.95		87,318.20				21,019.65
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	199.0	1,569	310,241	189.0	294,651			10.0	15,590
2.2	SUB-BASE COMP. SELECCI. 10KM CANT. RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	89.5	861	77,103	85.1	73,228			4.5	3,875
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					387,343.55		367,879.05				19,464.50
3 PAVIMENTO											
3.1	PAY. CONCR MR=36 E=0.15, INC. JUNTA	M2	199.0	14,184	2,822,616	189.0	2,680,776	10.0	141,840	0.0	-
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	56.7	833	47,231	63.0	52,479			-6.3	-5,248
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420mpa	KLS	33.1	312	10,339	103.1	32,167			-70.0	-21,828
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	60.0	7,196	431,760	60.0	431,760			0.0	-
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2.0	169,936	339,872			2.0	339,872	0.0	-
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10.8	9,355	101,034			10.3	96,544	0.5	4,490
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9.7	2,495	24,179			14.4	35,954	-4.7	-11,776
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	12.0	4,581	54,972					12.0	54,972
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1.0	40,531	40,531					1.0	40,531
SUBTOTAL PAVIMENTO					3,872,533.67		3,197,182.20		614,210.07		81,141.40
4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10,000	10,000					1.0	10,000
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12,474	12,474					1.0	12,474
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF-UAD 1/2"	UND	1.0	2,500	2,500			2.0	5,000	-1.0	-2,500
SUBTOTAL OTROS					24,974.00				5,000.00		19,974.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.4					4,383,188.07		3,652,379.45		619,210.07		\$ 121,599.55

CALLE 25C ENTRE CARRERA 15 Y AV SIMON BOLIVAR BARRIO LA GRACIELA - VIA No. 20						FECHA: 12-oct-16		CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT
1 PRELIMINARES													
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2.495	2.495							1.0	2.495
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAUCHO) (SR)	M3	648.6	748	485.153			510.0	381.480			138.6	103.673
1.3	DEMOLICION CONCRETO E=20CMS	M2	3.5	9.355	33.063							3.5	33.063
SUBTOTAL PRELIMINARES					520.711.10				381.480			139.231	
2 SUBBASE Y RELLENOS													
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	1081.0	1.559	1.685.279			425.0	662.575			656.0	1.022.704
2.2	SUB-BASE COMP. SELECCI. 10CM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	486.5	861	418.833							486.5	418.833
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					2.104.112.45				662.575			1.441.537	
3 PAVIMENTO													
3.1	PAV. CONCR MR=36 E=0.15 INC. JUNTA	M2	1081.0	14.184	15.332.904							1081.0	15.332.904
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	277.2	833	230.908							277.2	230.908
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	186.4	312	58.164							186.4	58.164
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	340.0	7.196	2.446.640							340.0	2.446.640
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	4.0	169.936	679.744							4.0	679.744
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21.6	9.355	202.068							21.6	202.068
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	19.4	2.495	48.357							19.4	48.357
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	24.0	4.581	109.944							24.0	109.944
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	2.0	40.531	81.062							2.0	81.062
SUBTOTAL PAVIMENTO					19.189.790.58							19.189.790.58	
4 OTROS													
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <= 3"	UND	1.0	10.000	10.000							1.0	10.000
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12.474	12.474							1.0	12.474
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PE-100 1/2"	UND	1.0	2.500	2.500							1.0	2.500
SUBTOTAL OTROS					24.974.00							24.974.00	

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.20	21.839.538.43
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.1-2-3-4-20	46.213.484.82

1.044.055.00	20.735.533.43
4.78%	95.22%
17.262.290.83	9.935.057.43
37.35%	21.50%
	19.016.136.36
	41.15%

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MILITE

Dennys A Delgado
DENNY APOLINAR DELGADO
Contratista

ING. ALEJANDRO DUEQUE
Residente de obra

ARQ. RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
Gerente de obra E.I.C.E

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 94377779	9	DENNYS APOLINAR DELGADO FLOREZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	dennysdelgado1964@hotmail.com	TULUA-VALLE	3104038156

Clave: 8457730804

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2016/10/13	0	\$0	\$2,306,900
2016/10/14	0	\$0	\$2,306,900
2016/10/18	4	\$8,400	\$2,315,300
2016/10/19	5	\$10,300	\$2,317,200
2016/10/20	6	\$12,600	\$2,319,500
2016/10/21	7	\$14,700	\$2,321,600
2016/10/24	10	\$20,900	\$2,327,800
2016/10/25	11	\$22,900	\$2,329,800
2016/10/26	12	\$24,900	\$2,331,800
2016/10/27	13	\$27,000	\$2,333,900

Período Pensión: 2016-09

Período Salud: 2016-10

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	18	\$1,192,000
COLFONDOS		3	\$143,500
COLPENSIONES		4	\$279,600
PORVENIR		9	\$629,100
PROTECCION		2	\$139,800
ARL	1	18	\$518,400
ARP SURA (ANTES SURATEP)		18	\$518,400
CCF	1	18	\$298,080
COMFANDI		18	\$298,080
EPS	5	18	\$298,420
CAFESALUD		3	\$52,500
COOMEVA		5	\$87,500
NUEVA E.P.S.		6	\$105,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		3	\$35,920
SANITAS		1	\$17,500
SUBTOTAL			\$2,306,900
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$2,306,900

Canales de Pago

BANCARIOS



-- COPIA CORRESPONSAL --

TRANSACTION EXITOSA
EN SEP 28, 16
COSTO DE TRANSACTION \$0.00
VER APP 1.81

AUTORIZACION NUMERO: 333042
TRANS: 516358 SEP 30, 16 - 13:47:51
BANCO DE OCCIDENTE
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
CUENTA CORRIENTE
PLANILLA AS. APORTES EN LINEA
FACTURA: 8457730804
FECHA PLANILLA: 28/09/16
UR PLANILLA: \$2,306,900.00
UR COMISION: \$0.00
UR IVA: \$0.00
PAGO APLICADO EN MM/DD: 09/30
TRANSACCION: *****1010
VALOR: \$2,306,900.00

PUNTO DE SERVICIO
No. 1491
Banco de Occidente

CORRESPONSAL
SERVIPABOS S.A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 94377779	9	DEHNNY APOLIMAR DELGADO FLOREZ	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	MANZANA B CASA 32 B/LA PAZ	TULUA-VALLE	2251704	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2016-09	2016-10		8457710804	E	2016/10/14	2016/10/13		0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF				
SUCURSAL: UNICA (18 Afiliados)															\$7,452,000	\$1,192,000			\$7,452,000	\$298,420			\$7,452,000	\$298,080			\$7,452,000	\$1,192,000	\$0			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO S (18 Afiliados)															\$7,452,000	\$1,192,000			\$7,452,000	\$298,420			\$7,452,000	\$298,080			\$7,452,000	\$1,192,000	\$0			
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (18 Afiliados)															\$7,452,000	\$1,192,000			\$7,452,000	\$298,420			\$7,452,000	\$298,080			\$7,452,000	\$1,192,000	\$0			
1	CC 16947329	ANGULO JHON	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
2	CC 1113312063	CARO DIEGO	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5016	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
3	CC 1116260241	CASTRO CRISTIAN	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
4	CC 94357342	CASTRO MARCELO	X	X									231001	1	\$23,000	\$3,700	EP5014	1	\$23,000	\$920	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	1	\$23,000	\$1,800	1	\$23,000	\$0	SI
5	CC 94365426	CRUZ CARLOS	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
6	CC 1112759972	GONZALEZ YESON	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
7	CC 11144	GUERRA CARLOS	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
8	CC 1109	HERRERA JHON	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
9	CC 10519	HERNANDEZ YEDIAN	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
10	CC 1626	MARTIN ALBA	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
11	CC 6241	MARTINEZ DIAGOBERDO	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
12	CC 9413	MILLAN OSCAR	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
13	CC 2471	MONTAÑA OSCAR	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
14	CC 9458	NICOLAI JHON	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
15	CC 1116	PALEZOS ROBERTO	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
16	CC 1623	PEREZ JHON	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
17	CC 9430	PEREZ ROBERTO	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
18	CC 1483	PEREZ ROBERTO	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EP5037	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,480	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI
Total Afiliados															\$7,452,000	\$1,192,000			\$7,452,000	\$298,420			\$7,452,000	\$298,080			\$7,452,000	\$1,192,000	\$0			

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 94377779		DELGADO FLOREZ DENNIS APOLINAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	seguridadyconfianza@gmail.com	TULUA-VALLE	3104038156

Clave: 8458236952

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2016/10/18	0	\$0	\$244,513
2016/10/19	0	\$0	\$244,513
2016/10/20	1	\$200	\$244,713
2016/10/21	2	\$500	\$245,013
2016/10/24	5	\$1,100	\$245,613
2016/10/25	6	\$1,400	\$245,913
2016/10/26	7	\$1,500	\$246,013
2016/10/27	8	\$1,700	\$246,213
2016/10/28	9	\$2,000	\$246,513
2016/10/31	12	\$2,600	\$247,113

Periodo Pensión: 2016-10

Periodo Salud: 2016-10

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$110,313
COLPENSIONES		1	\$110,313
ARL	1	1	\$48,000
ARP SURA (ANTES SURATEP)		1	\$48,000
EPS	1	1	\$86,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		1	\$86,200
SUBTOTAL			\$244,513
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$244,513

Canales de Pago

BANCARIOS



Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción \$300.000



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 81677338
 NUM REFERENCIA: 0000008458236952
 NUM IDENTIFICACION: 94377779
 PERIODO: 2016-10
 FECHA EFECTIVA: 2016-10-12
 VALOR: 244.513
 MIE12 OCT 16 17:17:20
 206-05597518-225
 776011-366043-444625-392260-45
 CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 9736 CLR 11078354
 05115149-377304

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tuluá.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS ASOAGRIN, DESCANSO, VERANERAS Y LA GRACIELA DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	DENNYS APOLINAR DELGADO
CONTRATO No.:	400-16-6.004
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

FOTOGRAFÍA (1)



Losa de Pavimento Barrio Asoagrin Farfan Calle 26E cras 1w y 2w

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tuluá.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS ASOAGRIN, DESCANSO, VERANERAS Y LA GRACIELA DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	DENNYS APOLINAR DELGADO
CONTRATO No.:	400-16-6.004
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016


FOTOGRAFÍA (2)



Instalación rejilla para sumidero Barrio asoagrin Calle 26E cras 1w y 2w

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tuluá.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS ASOAGRIN, DESCANSO, VERANERAS Y LA GRACIELA DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	DENNYS APOLINAR DELGADO
CONTRATO No.:	400-16-6.004
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

FOTOGRAFÍA (3)

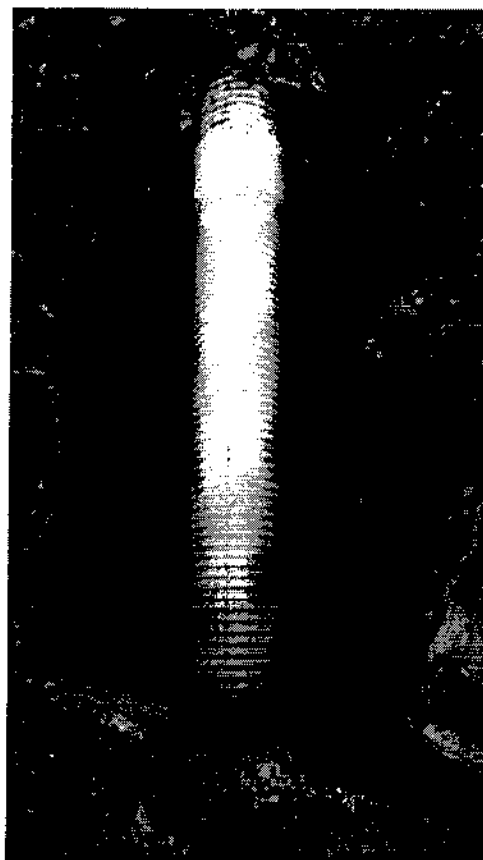

Instalación tubería para sumidero Barrio Asogarin Calle 26E cras 1w y 2w

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tuluá.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS ASOAGRIN, DESCANSO, VERANERAS Y LA GRACIELA DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	DENNYS APOLINAR DELGADO
CONTRATO No.:	400-16-6.004
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016


FOTOGRAFÍA (4)



Losa de pavimento en Barrio Asoagrin Calle 26E entre Cras 2w y 3w

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tulúa.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS ASOAGRIN, DESCANSO, VERANERAS Y LA GRACIELA DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	DENNYS APOLINAR DELGADO
CONTRATO No.:	400-16-6.004
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

FOTOGRAFÍA (5)

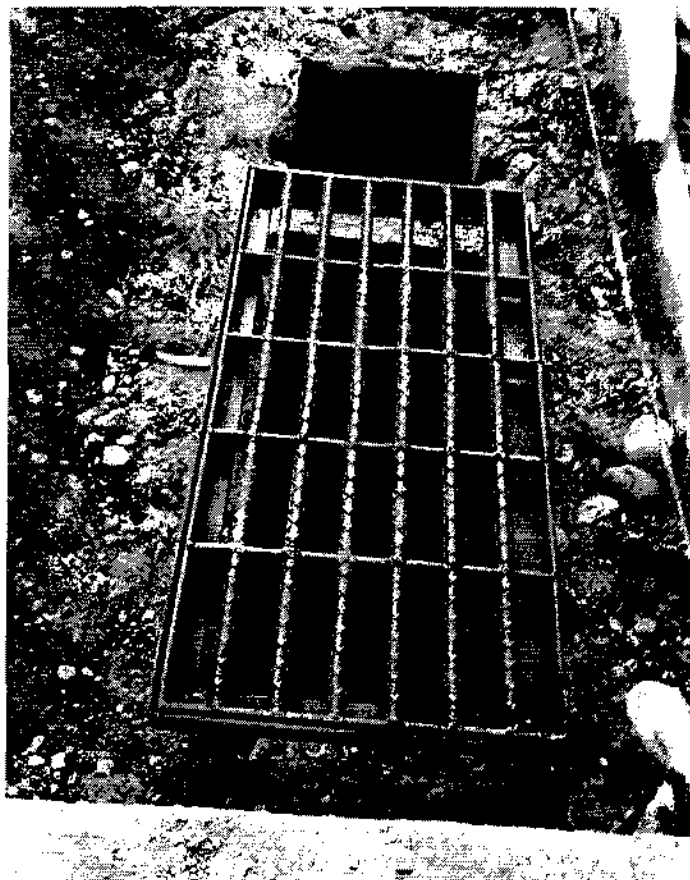

Sumideros en Barrio Asoagrin Calle 26E entre Cras 2w y 3w

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tulúa.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS ASOAGRIN, DESCANSO, VERANERAS Y LA GRACIELA DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	DENNYS APOLINAR DELGADO
CONTRATO No.:	400-16-6.004
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016


FOTOGRAFÍA (6)



Compactación subbase en Barrio el Descanso Carrera 3ª oeste Calle 26C6

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tulúa.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS ASOAGRIN, DESCANSO, VERANERAS Y LA GRACIELA DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	DENNYS APOLINAR DELGADO
CONTRATO No.:	400-16-6.004
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

FOTOGRAFÍA (7)



Construcción losa de pavimento Barrio el Descanso Carrera 3ª oeste Calle 26C6
