

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS		
Código: F-402-03	Versión: 02	Fecha de aprob:	Página: 1 de 2

No. CONTRATO	400-16-6.010	PERIODO DE RENDICIÓN	Octubre 01 - 2016	A	Octubre 15 - 2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSÉ NOÉ VIDALES				
INTERVENTOR	RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES			
Realizar la instalación de las señales verticales teniendo en cuenta las siguientes actividades: 1. Cerramiento preventivo para los 155 puntos de instalación 2. Realizar el corte de pavimento para las señales que se van a instalar en concreto. 3. Realizar la demolición del andén de 10 cm de espesor para las señales a instalar en concreto. 4. Realizar la excavación para una profundidad entre 30 y 40 cm para la instalación de las señales en cualquier tipo de superficie. 5. Instalar con la orientación adecuada, teniendo en cuenta el volumen de concreto adecuado para cada tipo de superficie.	1.1 Realizar el cerramiento preventivo para la instalación de 50 señales verticales. Teniendo en cuenta elementos como conos, cinta de peligro y bombones de guadua. Así como señal de trabajadores en la vía. 2.1 Realizar el corte del pavimento para la instalación de 15 señales en superficie de concreto. 3.1 Realizar la demolición del andén de 10 cm para la instalación de 15 señales verticales. 4.1 Realizar la excavación para una profundidad entre 30 y 40 cm para instalar las 55 señales verticales 5.1 Para la instalación de las señales verticales en suelo blando se realiza el vaciado de concreto para una	1.1.1. Se realizó el cerramiento preventivo para la instalación de 49 señales verticales con conos, delineadores de guadua y cinta de peligro. 3.1.1. Se realizó la demolición de 15 andenes de 10 cm de espesor con área de 30x30 cm. 4.1.1. Se realizó la excavación en 155 puntos para la instalación de las señales verticales, teniendo en cuenta las especificaciones dadas en el ítem 4.1. 5.1.1. Se realiza el anclaje de la señal con un volumen de concreto de 0,036 m3 para la instalaci			

		profundidad de 40 cm, mientras que para la instalación de las señales en concreto se realiza el relleno con material de sitio para una profundidad de 30 cm y se realiza la reconstrucción del andén para un espesor de 10 cm.	ón en superficie blanda y un volumen de concreto de 0.009 m3 para una superficie en concreto.
--	--	---	--

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	49	89	31.6
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	55		

COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ANEXOS: 1- Memorias de cantidades ejecutadas. Se entrega un total de evidencia de 17 folios

FIRMA
JOSÉ NOÉ VIDALES.
C.C. 16.351.331 TULUÁ

CONVENIO 240-16-02.001.003						ACTA PARCIAL No 01 DESDE OCTUBRE 01 A OCTUBRE 15 DE 2016				FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 15 DE 2016	
TRANSPORTE SEÑALIZACIÓN VIAL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. : 400-16-1.093						ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT
1.1	CERRAMIENTO PREVENTIVO	UND	155	15.767,0	2.443.885			49	\$ 772.583,00	106	\$ 1.671.302,00
SUBTOTAL TRANSPORTE					2.443.885,00				\$ 772.583,00		\$ 1.671.302,00

2.1	CORTADORA DE PAVIMENTO	ML	186	5.888,6	1.095.276			0	\$ -	186	\$ 1.095.275,88
2.2	DEMOL. ANDEN E=0.1 + RETIRO	GLB	155	2.038,0	315.890			15	\$ 30.570,00	140	\$ 285.320,00
2.3	EXCAVACION TIERRA A MANO V=0.027 M3	GLB	155	2.226,0	345.030			49	\$ 109.074,00	106	\$ 235.956,00
SUBTOTAL DEMOLICIONES					1.756.195,88				\$ 139.644,00		\$ 1.616.551,88

3.1	SEÑALIZACION VERTICAL LAMINA REFLECTIVA	UND	155	35.574,0	5.513.970			49	\$ 1.743.126,00	106	\$ 3.770.844,00
SUBTOTAL TRANSPORTE					5.513.970,00				\$ 1.743.126,00		\$ 3.770.844,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS TRANSPORTE					9.714.051,88
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

\$ 2.855.353,00

27,34%

\$ 7.058.698,88

72,66%

JOSÉ NÚE VIDALES
Contratista

Maria Claudia Garcia
ING. MARIA CLAUDIA GARCIA
Residente de obra

ARQ. RODOLFO RAMIREZ
Gerente Instituto E.I.C.E

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
		ACTA PARCIAL No 01					
FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 14 DE 2016							
CONTRATO DE OBRA No.: 400-16-6.010							
INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA							
VALOR CONTRATO		\$9.714.051		FECHA DE TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016			
PLAZO INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO				CONTRATISTA : JOSÉ NOÉ VIDALES			
FECHA DE INICIACIÓN : 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016				INTERVENTOR:		-	
ITEM	CERRAMIENTO PREVENTIVO					UNIDAD	UND
FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO
5/10/2016	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
6/10/2016	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
8/10/2016	Cll 26 - Cra 35	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 35 - Cll 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 34 - Cll 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 37 - Cll 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cll 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cll 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 37 - Cll 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cll 24 - Cra 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cll 24 - Cra 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cll 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
12/10/2016	Cra 38 - Cll 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 a - Cll 7	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 - Cll 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 - Cll 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cll 27 - Cra 38	-	-	-	1,00	UND	1,00
		-	-	-	1,00	UND	1,00

	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
13/10/2016	Cra 28 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 27 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 25 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 24 y 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 24 - CII 26 y 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 20	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 31 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 31 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 a - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
15/10/2016	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
							49,00

ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
JOSÉ NOÉ VIDALES
CONTRATISTA

Avaló

Firma:
MARÍA CLAUDIA GARCÍA CARDONA
ING. DIRECTOR DE OBRA:


Aprobó

Firma:
RODOLFO RAMÍREZ ALVAREZ
GERENTE INFITULUA E.I.C.E

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
ACTA PARCIAL No 01	
FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 15 DE 2016	
CONTRATO DE OBRA No.: 400-16-6.010	
INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA	
VALOR CONTRATO	\$9.714.051
FECHA DE TERMINACION:	22 DE NOVIEMBRE DE 2016
PLAZO INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	CONTRATISTA : JOSÉ NOÉ VIDALES
FECHA DE INICIACIÓN : 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016	INTERVENTOR: -

ITEM	DEMOL. ANDEN E=10 CM + RETIRO					UNIDAD	GLB
FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
8/10/2016	Cll 24 - Cra 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cll 24 - Cra 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
12/10/2016	Cra 38 - Cll 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 a - Cll 7	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 - Cll 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 - Cll 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
13/10/2016	Cra 27 - Cll 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cll 25 - Cra 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 25 - Cll 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cll 25 - Cra 24 y 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 24 - Cll 26 y 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cll 25 - Cra 20	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 31 - Cll 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 31 - Cll 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 a - Cll 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
							15,00

ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboró

Firma:
JOSÉ NOÉ VIDALES
CONTRATISTA


Avaló

Firma:
MARÍA CLAUDIA GARCÍA CARDONA
ING. DIRECTOR DE OBRA:

Aprobó

Firma:
RODOLFO RAMÍREZ ALVAREZ
GERENTE INPTULUA E.L.C.E

REGISTRO FOTOGRAFICO

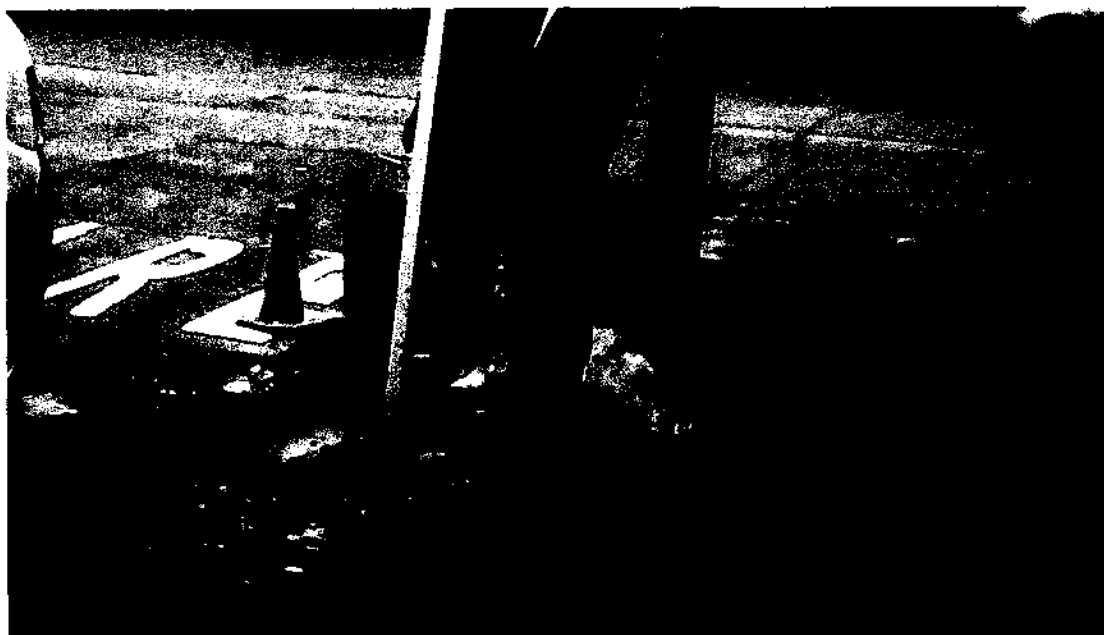

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
		ACTA PARCIAL No 01					
FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 14 DE 2016							
CONTRATO DE OBRA No.: 400-16-6.010							
INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA							
VALOR CONTRATO		\$9.714.051		FECHA DE TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016			
PLAZO INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO				CONTRATISTA : JOSÉ NOÉ VIDALES			
FECHA DE INICIACIÓN : 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016				INTERVENTOR:		-	
ITEM	EXCAVACION TIERRA A MANO					UNIDAD	GLB
FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
5/10/2016	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
6/10/2016	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
8/10/2016	Cli 26 - Cra 35	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 35 - Cli 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 34 -Cli 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 37 - Cli 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cli 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cli 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 37 - Cli 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cli 24 - Cra 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cli 24 - Cra 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
12/10/2016	Cra 38 - Cli 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cli 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 a - Cli 7	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 - Cli 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 - Cli 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cli 27 - Cra 38	-	-	-	1,00	UND	1,00

	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
13/10/2016	Cra 28 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 27 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 25 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 24 y 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 24 - CII 26 y 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 20	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 31 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 31 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 a - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
15/10/2016	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
							49,00

ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
JOSÉ NOÉ VIDALES
CONTRATISTA

Avaló

Firma:
MARÍA CLAUDIA GARCÍA CARDONA
ING. DIRECTOR DE OBRA:

Aprobó

Firma:
RODOLFO RAMÍREZ ALVAREZ
GERENTE INFUTULUA E.I.C.E

REGISTRO FOTOGRAFICO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
ACTA PARCIAL No 01							
FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 14 DE 2016							
CONTRATO DE OBRA No. : 400-16-6.010							
INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA							
VALOR CONTRATO	\$9.714.051	FECHA DE TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016					
PLAZO INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	CONTRATISTA : JOSÉ NOÉ VIDALES						
FECHA DE INICIACIÓN : 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016	INTERVENTOR: -						
ITEM	SEÑALIZACION LAMINA REFLECTIVA					UNIDAD	UND
FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
5/10/2016	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
6/10/2016	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
8/10/2016	Cra 35 - Cl 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 34 - Cl 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 37 - Cl 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cl 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cl 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 37 - Cl 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cl 24 - Cra 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cl 24 - Cra 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cl 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - Cl 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
12/10/2016	Cra 38 a - Cl 7	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 - Cl 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 - Cl 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cl 27 - Cra 38	-	-	-	1,00	UND	1,00
		-	-	-	1,00	UND	1,00

	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
13/10/2016	Cra 28 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 27 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 25 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 24 y 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 24 - CII 26 y 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 20	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 31 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 31 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 a - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
15/10/2016	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
							49,00

ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

JOSÉ NOÉ VIDALES
CONTRATISTA

Avaló



Firma:

MARÍA CLAUDIA GARCÍA CARDONA
ING. DIRECTOR DE OBRA:




Aprobó

Firma:

RODOLFO RAMÍREZ ALVAREZ
GERENTE INSTITULUA E.I.C.E

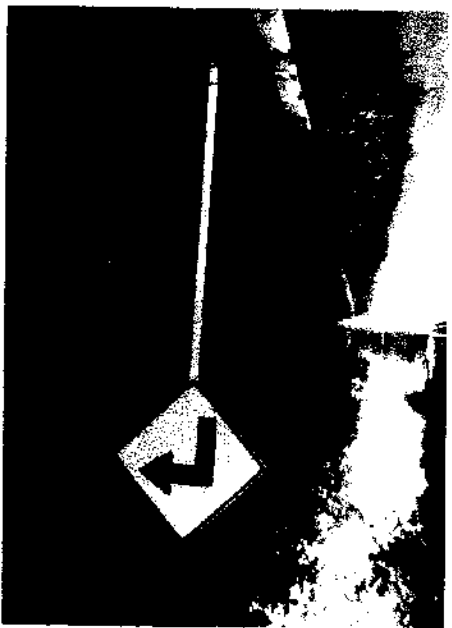

REGISTRO FOTOGRAFICO

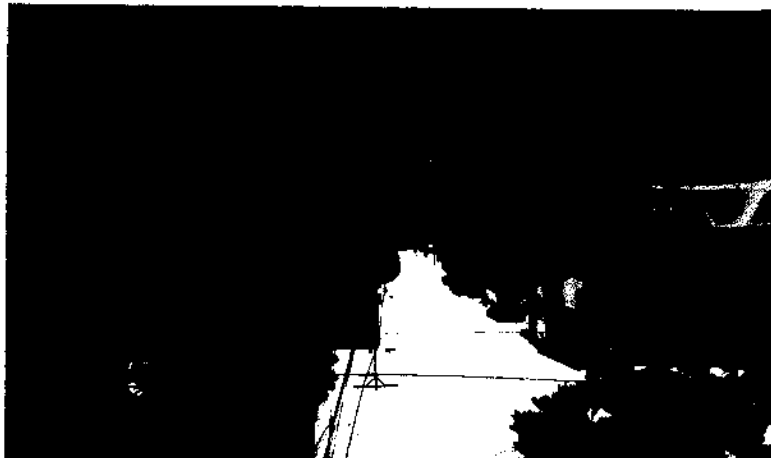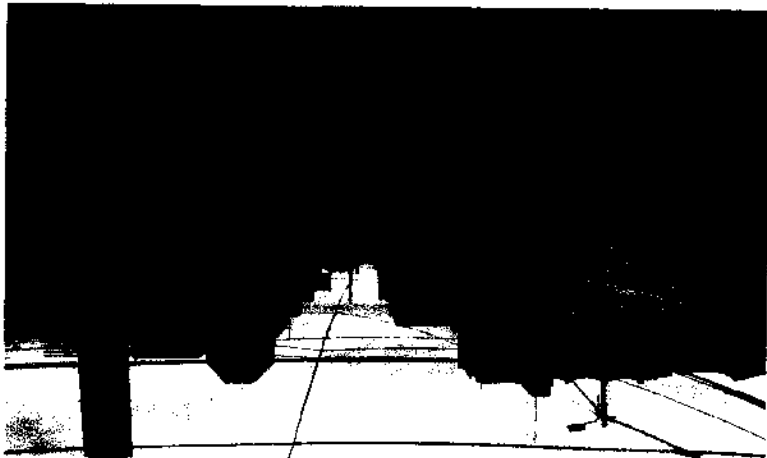

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NT 16351331	7	VIDALES JOSE NOE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	josenoevidales@hotmail.com	TULUA-VALLE	3166205752

Clave: 8458238511

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2016/10/12	6	\$1,300	\$257,700
2016/10/13	7	\$1,700	\$258,100
2016/10/14	8	\$1,900	\$258,300
2016/10/18	12	\$2,800	\$259,200
2016/10/19	13	\$3,100	\$259,500
2016/10/20	14	\$3,200	\$259,600
2016/10/21	15	\$3,400	\$259,800
2016/10/24	18	\$4,000	\$260,400
2016/10/25	19	\$4,400	\$260,800
2016/10/26	20	\$4,500	\$260,900

Periodo Pensión: 2016-09

Periodo Salud: 2016-10

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	4	\$133,100
PORVENIR		4	\$133,100
ARL	1	4	\$57,900
ARP SURA (ANTES SURATEP)		4	\$57,900
CCF	1	4	\$33,400
CONFANDI		4	\$33,400
EPS	3	4	\$33,300
COOMEVA		2	\$16,700
NUEVA E.P.S.		1	\$8,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		1	\$8,300
SUBTOTAL			\$257,700
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$257,700

Canales de Pago

BANCARIOS



Puntos autorizados de la red Vía
Monto máximo por transacción \$300.000

PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 81680423
NUM REFERENCIA: 0000008458238511
NUM IDENTIFICACION: 16351331
PERIODO: 2016-10
FECHA EFECTIVA: 2016-10-12
VALOR: 258.100
MIE12 OCT 16 17:22:28
296-07356812-230
776012-296851-044625-392260-41
CONSERVE ESTE TIOUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT: 9736 CLR 11078354
03190405-933960
