

No. CONTRATO	400-16-6.010	PERIODO DE RENDICIÓN	Octubre 16 - 2016	A	Octubre 31 - 2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSÉ NOÉ VIDALES				
INTERVENTOR	RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES		RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES		
Realizar la instalación de las señales verticales teniendo en cuenta las siguientes actividades: 1. Cerramiento preventivo para los 155 puntos de instalación 2. Realizar el corte de pavimento para las señales que se van a instalar en concreto. 3. Realizar la demolición del andén de 10 cm de espesor para las señales a instalar en concreto. 4. Realizar la excavación para una profundidad entre 30 y 40 cm para la instalación de las señales en cualquier tipo de superficie. 5. Instalar con la orientación adecuada, teniendo en cuenta el volumen de concreto adecuado para cada tipo de superficie.	1.1 Realizar el cerramiento preventivo para la instalación de 106 señales verticales. Teniendo en cuenta elementos como conos, cinta de peligro y bombones de guadua. Así como señal de trabajadores en la vía. 2.1 Realizar el corte de 186 ml de pavimento para la instalación de señales en superficie de concreto. 3.1 Realizar la demolición del andén de 10 cm para la instalación de 140 señales verticales. 4.1 Realizar la excavación para una profundidad entre 30 y 40 cm para instalar las 106 señales verticales 5.1 Para la instalación de las señales verticales en suelo blando se realiza el vaciado de concreto para una		1.1.1. Se realizó el cerramiento preventivo para la instalación de 106 señales verticales con conos, delineadores de guadua y cinta de peligro. 2.1.1. Se realizó el corte de 186 ml para la instalación de las señales verticales. 3.1.1. Se realizó la demolición de 140 andenes de 10 cm de espesor con área de 30x30 cm. 4.1.1. Se realizó la excavación en 106 puntos para la instalación de las señales verticales, teniendo en cuenta las especificaciones dadas en el ítem 4.1.		


		profundidad de 40 cm, mientras que para la instalación de las señales en concreto se realiza el relleno con material de sitio para una profundidad de 30 cm y se realiza la reconstrucción del andén para un espesor de 10 cm.	5.1.1. Se realiza el anclaje de la señal con un volumen de concreto de 0,036 m3 para la instalación en superficie blanda y un volumen de concreto de 0.009 m3 para una superficie en concreto.
--	--	--	--

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	613	100	100
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	613		

COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ANEXOS:
	1- Memorias de cantidades ejecutadas.

FIRMA
JOSÉ NOÉ VIDALES.
C.C. 16.351.331 TULUÁ

CONVENIO 240-16-02.001.003						ACTA FINAL DESDE OCTUBRE 16 A OCTUBRE 31 DE 2016				FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 31 DE 2016	
TRANSPORTE SEÑALIZACIÓN VIAL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 400-16-6.010						ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PREVENTIVO	UND	155	15.767,0	2.443.885	49	772.583,0	106,00	\$ 1.671.302,00	0,00	\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTE					2.443.885,00	\$ 772.583,00		\$ 1.671.302,00		\$ -	
2 DEMOLICIONES											
2.1	CORTADORA DE PAVIMENTO	ML	186	5.888,6	1.095.276	0	-	186,00	\$ 1.095.275,88	0	\$ -
2.2	DEMOL. ANDEN E=0.1 + RETIRO	GLB	155	2.038,0	315.890	15	30.570,0	140,00	\$ 285.320,00	0,00	\$ -
2.3	EXCAVACION TIERRA A MANO V=0.027 M3	GLB	155	2.226,0	345.030	49	109.074,0	106,00	\$ 235.956,00	0,00	\$ -
SUBTOTAL DEMOLICIONES					1.756.195,88	\$ 139.644,00		\$ 1.616.551,88		\$ -	
3 INSTALACION DE SEÑAL											
3.1	SEÑALIZACION VERTICAL LAMINA REFLECTIVA	UND	155	35.574,0	5.513.970	49	1.743.126,0	106,00	\$ 3.770.844,00	0,00	\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTE					5.513.970,00	\$ 1.743.126,00		\$ 3.770.844,00		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS TRANSPORTE					9.714.051,00	\$ 2.555.353,00		\$ 7.058.698,00		\$ -	
						27,34%		72,66%		0,00%	


 JOSE NOÉ VDALES
 Contratista


 ING. MARIA CLAUDIA GARCIA
 Residente de obra

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
		ACTA PARCIAL No 02						
FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 31 DE 2016								
CONTRATO DE OBRA No. : 400-16-6.010								
INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA								
VALOR CONTRATO		\$9.714.051		FECHA DE TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016				
PLAZO INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO				CONTRATISTA : JOSE NOE VIDALES				
FECHA DE INICIACIÓN : 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016				INTERVENTOR:		-		
ITEM	CORTADORA DE PAVIMENTO					UNIDAD	UND	
FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
19/10/2016	Tres esquinas	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Tres esquinas	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Tres esquinas	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Tres esquinas	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Tres esquinas	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Tres esquinas	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
20/10/2016	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 26 - Cra 35	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 35 - Cra 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 34 -Cra 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 37 - Cra 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 38 - Cra 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 38 - Cra 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 37 - Cra 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 24 - Cra 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 24 - Cra 27	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 38 - Cra 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 38 - Cra 27	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 38 a - Cra 7	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 32 - Cra 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
21/10/2016	Cra 32 - Cra 27	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	
	Cra 27 - Cra 38	1,20	-	-	1,20	ML	1,20	

	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 28 - CII 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 27 - CII 25 y 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 25 y 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 25 - CII 25 y 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 24 y 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 24 - CII 26 y 27	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 20	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 31 - CII 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 31 - CII 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 32 a - CII 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Tres esquinas	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
24/10/2016	Campoalegre	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 28 - Cra 38	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 28 a - CII 14	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 28 a - CII 14	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 18 - Cra 29	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 27 - Cra 34	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 27 - CII 40 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 21 - Piscinas olímpicas N.S	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 21 - Piscinas olímpicas S.N	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 48 - Cementerio los Olivos O.E	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 27 bis - CII 40 b	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 27 bis - CII 40 b	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 30 a - Cra 20 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 24 - Cra 39	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 27 - Cra 38	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 27 - CII 25 y 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 18 a - CII 32 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 18 a - CII 32 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 18 a - CII 34 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 18 a - CII 34 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
25/10/2016	Cra 19 - CII 30 S.N	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 24 - Cra 21	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 24 - Cra 23	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 22 - CII 27	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 26 - Cra 32 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Campoalegre - escuela	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 26 a - Cra 16	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 26 b - Cra 17	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 26 b - Cra 17	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 26 - Cra 16	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 26 - Cra 16	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 14 - CII 26 b	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 14 - CII 26 b	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 29 - Cra 23	1,20	-	-	1,20	ML	1,20

	CII 29 - Cra 39	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 27 - CII 37	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 25 - CII 35	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 24 - CII 39 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 26 - CII 38	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 34 - Cra 35	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 3	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 3	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 3 oeste - CII 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 3 oeste - CII 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 22 - Cra 2 oeste	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 1 oeste	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 1 oeste	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 23 - CII 12	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 22 - CII 16	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 3b - Cra 24	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 4 b - Cra 24	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
27/10/2016	Cra 17 - CII 7 y 7 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 17 - CII 7 y 7 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 17 - CII 9 b	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 17 - CII 9 b	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Diag 23 - Cra 21	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 20 - CII 8	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 1 oeste	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 1 oeste	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 3 oeste - CII 20	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 3 oeste - CII 20	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 28 - Via ppal Aguacalara	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Inspeccion de policia Aguacalara S.N	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Inspeccion de policia Aguacalara N.S	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 28 - Aguacalara antes de via ferrea	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Aguacalara - Urb. El Paraiso	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 21 - Cra 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 21 - Cra 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 12 b - Cra 28 a 2	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 21 - Cra 5	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 21 - Cra 5	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 5 - CII 21 b	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 25 - Cra 8	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 8 - CII 22 c	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Diag 23 - Cra 21	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 5 - Cra 22	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 20 - CII 3 c	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 20 - CII 1 a	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 24 - Tv 12	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Diag 23a - Tv 12	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 21 - Cra 13	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 18 - CII 14 c	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 22 - CII 16	1,20	-	-	1,20	ML	1,20

	Cra 24 - CII 12	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 24 a - CII 14	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 24 a - CII 16	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 19 - CII 30 N.S	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
29/10/2016	Cra 23 - CII 34	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 23 - Cra 23	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 21 - Cra 22	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 21 - Cra 35	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 34 - Cra 33	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 35 - CII 29	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 29 - Cra 39	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 33 - CII 28	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 38 - CII 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 35 - CII 27	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 24 - Cra 23	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 21 - CII 27	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 21 - CII 28	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 32 a - CII 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 33 - CII 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 33 - CII 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 33 - CII 26	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	Cra 33a - CII 25	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 27 - Cra 38	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
	CII 24 - Cra 22	1,20	-	-	1,20	ML	1,20
							166,00

ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
JOSÉ NOÉ VIDALES
CONTRATISTA

Aprobó

Firma:
MARÍA CLAUDIA GARCÍA CARDONA
ING. RESIDENTE DE OBRA

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
		ACTA PARCIAL No 02						
FECHA DEL ACTA: OCTUBRE 31 DE 2016								
CONTRATO DE OBRA No. : 400-16-6.010								
INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA								
VALOR CONTRATO		\$9.714.051		FECHA DE TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016				
PLAZO INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO		CONTRATISTA : JOSE NOE VIDALES						
FECHA DE INICIACIÓN : 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016		INTERVENTOR:		-				
ITEM	DEMOL. ANDÉN E=10 CM + RETIRO					UNIDAD	GLB	
FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
19/10/2016	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	CII 26 - Cra 35	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 35 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 34 -CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 37 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
20/10/2016	Cra 38 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 38 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 37 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	CII 24 - Cra 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	CII 24 - Cra 27	-	-	-	1,00	UND	1,00	
21/10/2016	Cra 38 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 38 - CII 27	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 38 a - CII 7	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 32 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 32 - CII 27	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	CII 27 - Cra 38	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 28 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
24/10/2016	Cra 27 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	CII 25 - Cra 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 25 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	CII 25 - Cra 24 y 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 24 - CII 26 y 27	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	CII 25 - Cra 20	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 31 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 31 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Cra 32 a - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00	
	Tres esquinas	-	-	-	1,00	UND	1,00	

	Campoalegre	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 28 - Cra 38	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 28 a - CII 14	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 28 a - CII 14	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 18 - Cra 29	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 27 - Cra 34	-	-	-	1,00	UND	1,00
24/10/2016	Cra 27 - CII 40 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 21 - Piscinas olimpicas N.5	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 21 - Piscinas olimpicas S.N	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 48 - Cementerio los Olivos O.E	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 27 bis - CII 40 b	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 27 bis - CII 40 b	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 30 a - Cra 20 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 24 - Cra 39	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 27 - Cra 38	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 27 - CII 25 y 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 18 a - CII 32 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 18 a - CII 32 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 18 a - CII 34 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 13 a - CII 34 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 19 - CII 30 S.N	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 24 - Cra 21	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 24 - Cra 23	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 22 - CII 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 26 - Cra 32 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Campoalegre - escuela	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 26 a - Cra 16	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 26 b - Cra 17	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 26 b - Cra 17	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 26 - Cra 16	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 26 - Cra 16	-	-	-	1,00	UND	1,00
25/10/2016	Cra 14 - CII 26 b	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 14 - CII 26 b	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 29 - Cra 23	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 29 - Cra 39	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 27 - CII 37	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 25 - CII 35	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 24 - CII 39 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 26 - CII 38	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 34 - Cra 35	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 3	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 3	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 3 oeste - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 3 oeste - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00

	CII 22 - Cra 2 oeste	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 1 oeste	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 1 oeste	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 23 - CII 12	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 22 - CII 16	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 3b - Cra 24	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 4 b - Cr 24	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 17 - CII 7 y 7 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 17 - CII 7 y 7 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 17 - CII 9 b	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 17 - CII 9 b	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Diag 23 - Cra 21	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 20 - CII 8	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 1 oeste	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 1 oeste	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 3 oeste - CII 20	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 3 oeste - CII 20	-	-	-	1,00	UND	1,00
27/10/2016	Cra 28 - Via ppal Aguacilara	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Inspeccion de policia Aguacilara S.N	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Inspeccion de policia Aguacilara N.S	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 28 - Aguacilara antes de via ferrea	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Aguacilara - Urb. El Paraiso	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 21 - Cra 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 21 - Cra 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 12 b - Cra 28 a 2	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 21 - Cra 5	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 21 - Cra 5	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 5 - CII 21 b	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 25 - Cra 8	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 8 - CII 22 c	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Diag 23 - Cra 21	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 5 - Cra 22	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 20 - CII 3 c	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 20 - CII 1 a	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 24 - Tv 12	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Diag 23a - Tv 12	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 21 - Cra 13	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 18 - CII 14 c	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 22 - CII 16	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 24 - CII 12	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 24 a - CII 14	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 24 a - CII 16	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 19 - CII 30 N.S	-	-	-	1,00	UND	1,00

29/10/2016	Cra 23 - CII 34	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 23 - Cra 23	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 21 - Cra 22	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 21 - Cra 35	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 34 - Cra 33	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 35 - CII 29	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 29 - Cra 39	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 33 - CII 28	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 38 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 35 - CII 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 24 - Cra 23	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 21 - CII 27	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 21 - CII 28	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 32 a - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 33 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 33 - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 33 - CII 26	-	-	-	1,00	UND	1,00
	Cra 33a - CII 25	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 27 - Cra 38	-	-	-	1,00	UND	1,00
	CII 24 - Cra 22	-	-	-	1,00	UND	1,00
							140,00

ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboró

Firma:
JOSÉ NOÉ VIDALES
CONTRATISTA


Aprobó

Firma:
MARÍA CLAUDIA GARCÍA CARDONA
ING. RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

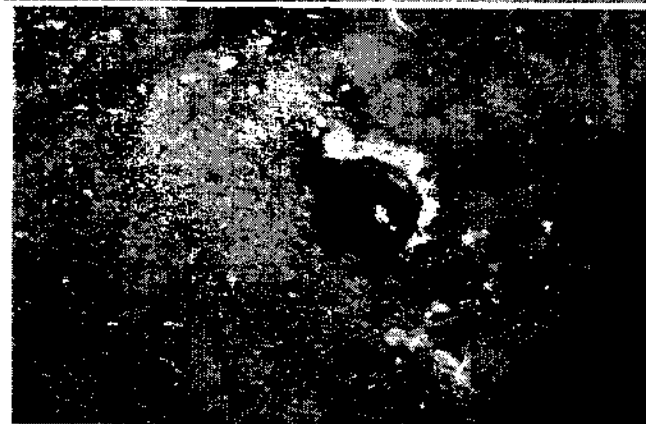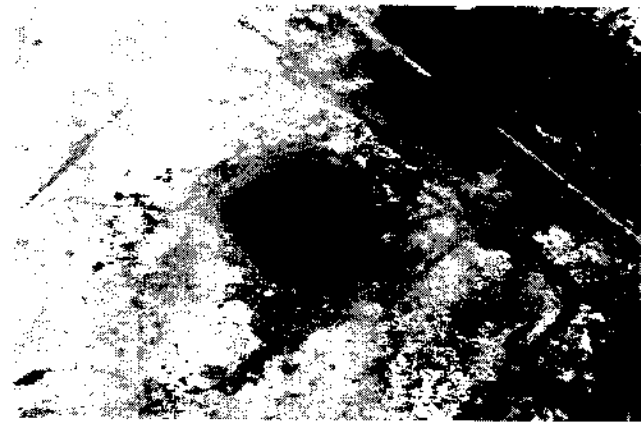



REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

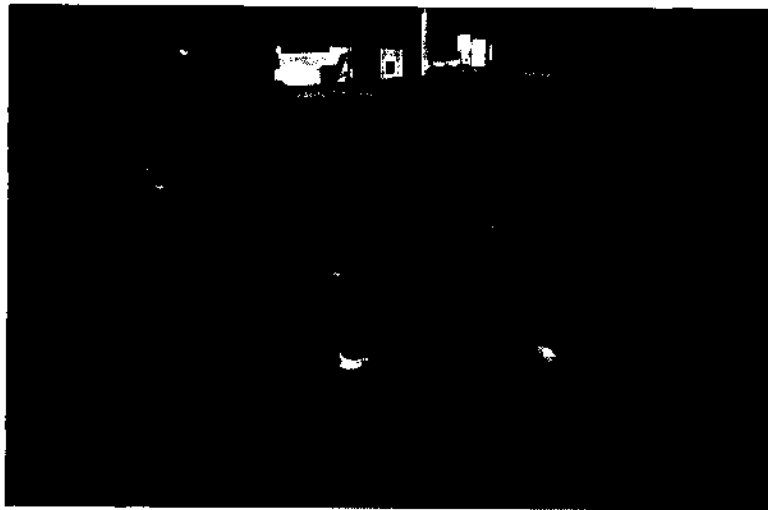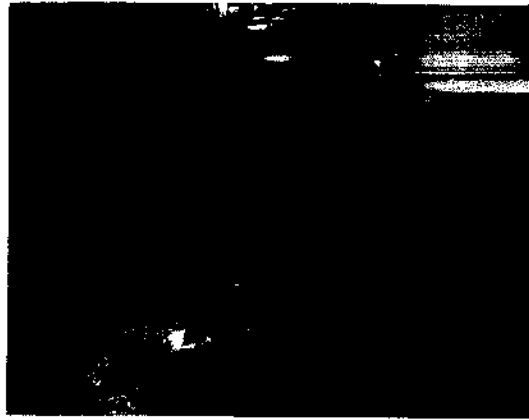


REGISTRO FOTOGRÁFICO

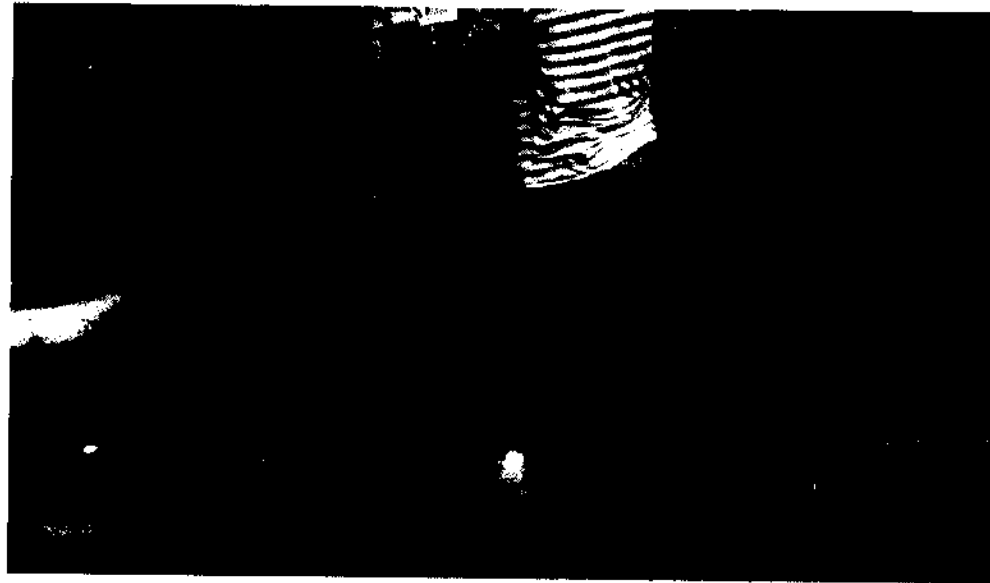

REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO

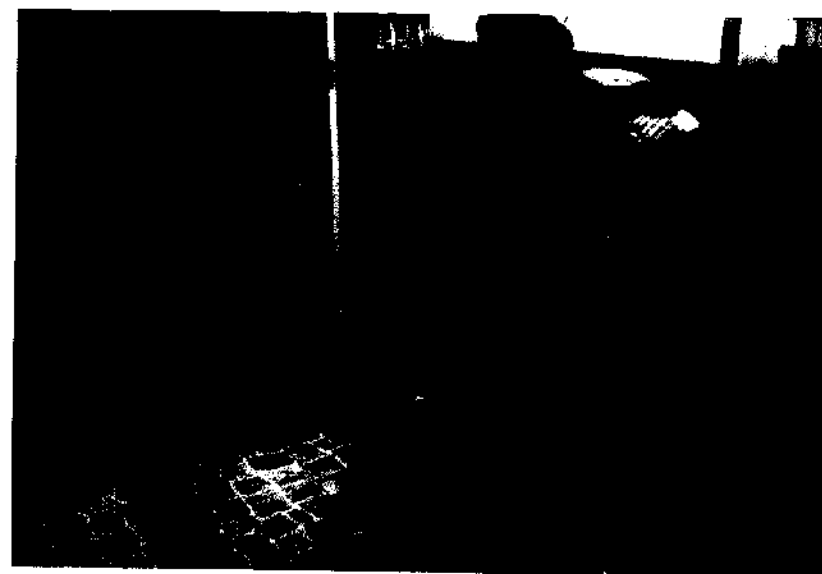

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

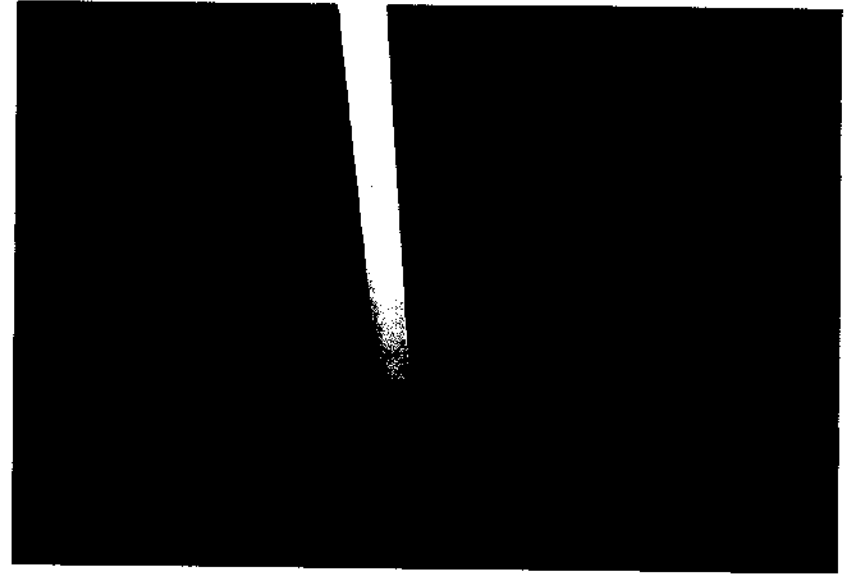

REGISTRO FOTOGRAFICO



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 16351331	7	VIDALES JOSE NOE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	josenoevidales@hotmail.com	TULUA-VALLE	3166205752

Clave: 8458238511

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2016/10/12	6	\$1,300	\$257,700
2016/10/13	7	\$1,700	\$258,100
2016/10/14	8	\$1,900	\$258,300
2016/10/18	12	\$2,800	\$259,200
2016/10/19	13	\$3,100	\$259,500
2016/10/20	14	\$3,200	\$259,600
2016/10/21	15	\$3,400	\$259,800
2016/10/24	18	\$4,000	\$260,400
2016/10/25	19	\$4,400	\$260,800
2016/10/26	20	\$4,500	\$260,900

Periodo Pensión: 2016-09

Periodo Salud: 2016-10

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	4	\$133,100
PORVENIR		4	\$133,100
ARL	1	4	\$57,900
ARP SURA (ANTES SURATEP)		4	\$57,900
CCF	1	4	\$33,400
COMFANDI		4	\$33,400
EPS	3	4	\$33,300
COOMEVA		2	\$16,700
NUEVA E.P.S.		1	\$8,300
S.D.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		1	\$8,300

SUBTOTAL	\$257,700
COMISION OPERADOR	\$0
IVA	\$0
TOTAL	\$257,700

Canales de Pago

BANCARIOS



Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción \$300.000

PAGO DE FACTURAS

RILA BP

NUM. APROBACION 81680423
NUM. REFERENCIA 0000008458238511
NUM. IDENTIFICACION 16351331
PERIODO 2016-10
FECHA EFECTIVA 2016-10-12
VALOR 258.100
MIE12 OCT 16 17:22:28
296-07356812-230
776012-296051-044625-392260-41
CONSERVE ESTE TIOUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A
A SU OPERADOR
AGT 9726 CLR 11078354
003190405-933960
