

No. CONTRATO	400-16-6.002	PERIODO DE RENDICIÓN	19 de AGOSTO	A	31 de AGOSTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NELSON BEDOYA MORALES				
SUPERVISOR	Arq. RODOLFO RAMIREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES		RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES		
A. Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas y las cantidades de obra que hacen parte del mismo. B. A efectuar su trabajo con el máximo de rapidez, eficiencia, responsabilidad personal y profesional. C. Para garantizar el presente contrato el CONTRATISTA constituirá a favor de INIFITULUA E.I.C.E- CONTRATANTE una garantía para avalar el cumplimiento del CONTRATO y sus obligaciones vigentes durante el tiempo de ejecución del CONTRATO y su liquidación debiendo	-Coordinación y ejecución trabajos de instalación redes eléctricas sector norte y acometida sector oriente. -Coordinación y ejecución trabajos de protección estructura de cubierta y recorrido de teja sector nor-occidente.		-Se realizó cableado de ductos de tomas e interruptores y se instalaron apliques de tomas e interruptores en el sector norte. -Se aplicó material protector en los elementos de madera de la estructura de cubierta (cerchas y correas) para evitar deterioro por humedad o ataque por insectos. Se hizo el recorrido de la teja reubicando elementos y cambio piezas en mal estado.		

ejecución del CONTRATO y su liquidación debiendo amparar las siguientes

GARANTÍAS: De conformidad con el artículo 5 literal D del manual De contratación de Infituluá E.I.C.E en calidad de contratante requerirán constituir las siguientes:

a) De cumplimiento por el 10% del valor total hasta la liquidación del contrato;

b) amparo de calidad del servicio contratado por una suma equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia contada a partir de la firma del acta de iniciación de actividades, por el termino de duración del mismo y cuatro meses más.

-Coordinación y ejecución trabajos de instalación redes hidrosanitarias, sector sur

Fundición piso en concreto llanado sector sur.

Rasqueteada, repello, estuco sector sur y oriente.

-Coordinación y ejecución trabajos de restauración estructura de cubierta, cambio de cañabrava, sector oriente.

-Definición de pendiente de instalación de tubería sanitaria, localización de puntos sanitarios (sifones, desagües), construcción cajas de inspección, sector sur

-Se fundió el piso en concreto llanado con espesor de 10cm del corredor central del sector sur y laterales.

-Se retiró pintura sueltas y en mal estado, se realizó resanes y filos de repello del sector sur y oriente, se inició estucos en muros de estos sectores.

-Se revisó, se identifico y se realizó cambios de las piezas en mal estado de la estructura de cubierta, también se realizó el cambio de cañabrava en mal estado de la cubierta del sector oriente.

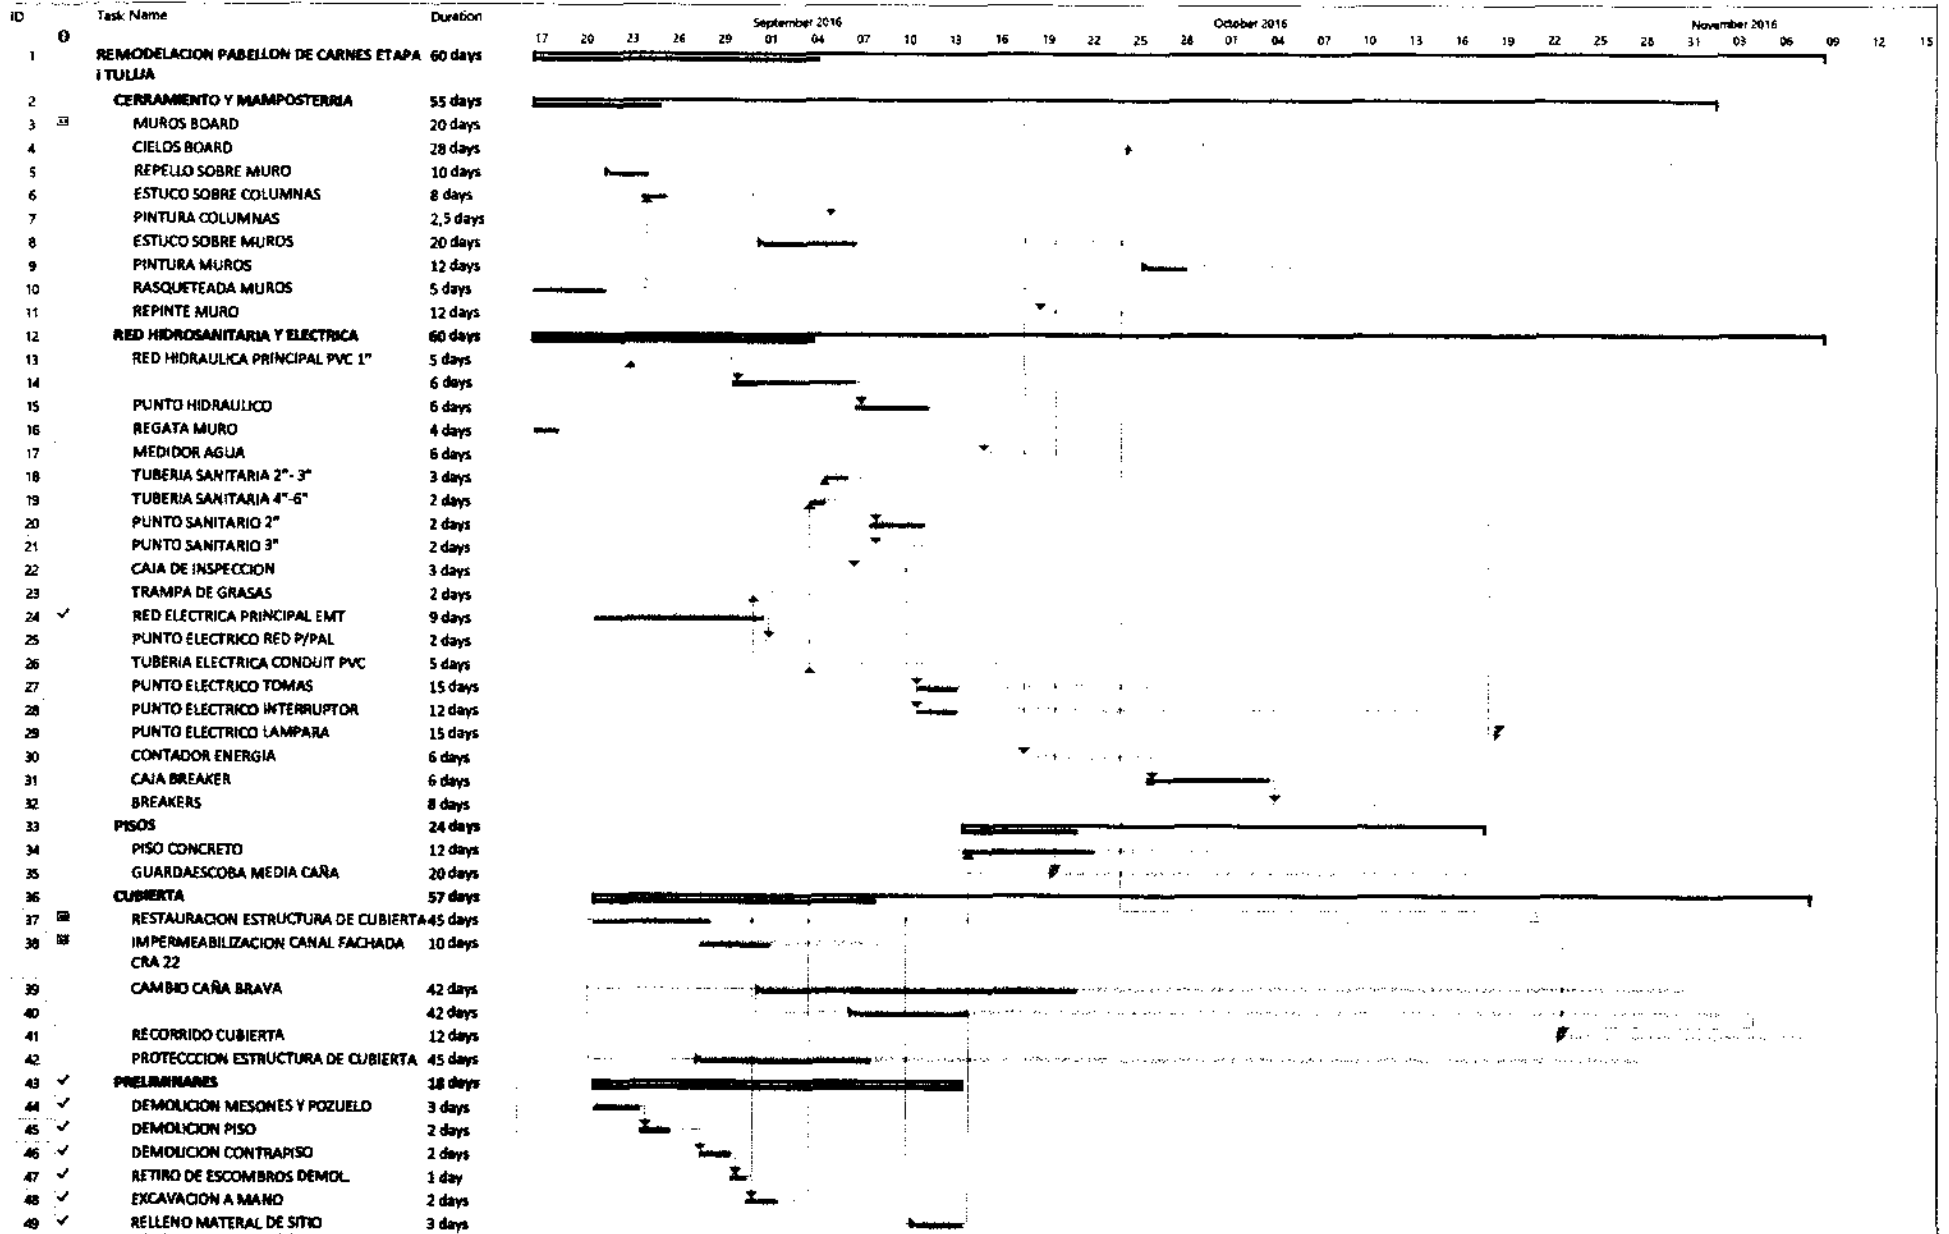
 IN ITULUA Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Tuluá		INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02	Fecha de aprob: 31/MAR/2010	Página: 3 de 3

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS		16,8	16,8
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos ó negativos)				
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	Se anexa soporte de las cantidades ejecutadas y registro fotográfico.			

FIRMA: 

NELSON BEDOYA MORALES
C.C. 16.255.886 de Tuluá

TERMINACIÓN REMODELACION PABELLON DE CARNES TULUA
PROYECTO INRITULUA



AVANCE DE OBRA

REMODELACION PABELLON DE CARNES TULUA VALLE

CONTRATO DE MANO DE OBRA No 400-16-4.002

OBJETO
REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUA. Para la realizacion de la obra el contratista suministrara mano de obra y equipos.

CONTRATISTA: MISON BEDOYA
NIT. No 16.353.886

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 400-16-1.080

OBJETO
SUPERVISION DE LA OBRA "REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUA. Para la realizacion de la obra el contratista suministrara mano de obra y equipos."

SUPERVISOR: Ing. EDUARDO LORES QUINTERO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
CONEXIONES ACTUALES					
1	CERRAMIENTO Y ACABADOS				
1-1	MUROS BORDO	m2	211	23.134	4.875.219
1-2	CELOS BOARD	m2	379	8.008	3.035.906
1-3	REFLEJO SOBRE MURO	m2	82	666.637	54.143.56
1-4	ESTUCCO SOBRE COLUMNAS	m2	336	2.310	776.160
1-5	PEINTURA COLUMNAS	m2	158	3.465	542.120
1-6	ESTUCCO SOBRE MUROS	m2	368	3.400	1.251.200
1-7	PEINTURA MUROS	m2	742	3.405	2.527.070
1-8	PASADUELA MUROS	m2	404	963	388.368
1-9	REPINTO MURO	m2	395	1.348	532.560
	SUBTOTAL ACUMULADA EN ESTRUCTURA GENERAL SUBESTACION				14.178.878

2	RED SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTROICA				
2-1-1	RED HIDRAULICA PRINCIPAL PVC 1"	ml	103	774	79.722
2-1-2	TUBERIA HIDRAULICA PVC 1/2"	ml	62	770	47.355
2-1-3	PUNTO HIDRAULICO	pvc	35	19.250	673.750
2-1-4	REGATA MURO	ml	58	1.356	78.835
2-1-5	MECATOR AGUA	und	17	13.298	226.066
2-1-6	TUBERIA SANITARIA 2" 3"	ml	18	2.700	48.600
2-1-7	TUBERIA SANITARIA 4" 6"	pvc	12	2.329	27.951
2-1-8	PUNTO SANITARIO 2"	pvc	9	10.638	95.746
2-1-9	PUNTO SANITARIO 3"	und	3	21.277	63.830
2-1-10	CAJA DE INSPECCION	und	2	92.841	185.682
2-2	TRAMPA DE GRASAS	und	3	17.349	52.047
2-2-1	RED ELECTROICA PRINCIPAL ENT	ml	129	5.880	758.520
2-2-4	PUNTO ELECTROICO TOMAS	pvc	88	27.899	2.455.138
2-2-5	PUNTO ELECTROICO INTERRUPTOR	pvc	71	27.899	1.980.850
2-2-6	PUNTO ELECTROICO LAMPARA	pvc	71	23.080	1.638.705
2-3	CONDADOR ENERGIA	und	27	68.042	1.837.134
2-3-1	CAJA BREAKER	und	19	25.363	481.897
2-3-2	PRENERS	und	51	14.887	758.837
	SUBTOTAL PRELIMINARES				10.778.787

3	CUBIERTAS				
3-1	RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	568	28.891	16.374.130
3-2	IMPERMEABILIZACION CANAL FACHADA ORA 22	ml	45	18.116	815.220
3-3	CAMBIO CABLE BRANVA	m2	351	6.341	2.226.255
3-4	RECORRIDO CUBIERTA	m2	695	2.489	1.699.285
3-5	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	24	3.051	73.213
3-6	PROTECCION ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ml	1.754	2.058	3.579.354
	SUBTOTAL PRELIMINARES				28.833.487

4	PISOS				
4-1	PISO CONCRETO	m2	208	12.681	2.639.710
4-2	GUARNESCOBA MEDIA CARA	ml	286	5.435	1.554.895
	SUBTOTAL PRELIMINARES				4.194.605

5	VARIOS				
5-1	DEMOLICION MASONES Y POZUELO	m2	23	13.558	311.834
5-2	DEMOLICION PISO	m2	22	2.094	46.068
5-3	DEMOLICION CONTRAPISO	ml	20	3.390	67.790
5-4	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	10	3.051	29.051
5-6	RELLENO MATERIAL DE SITO	m3	7	8.101	42.857
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS				488.179

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 86.178.882

COSTOS INDIRECTOS					
TOTAL COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS	0				86.178.882
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					86.000.000

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: SESENTA (60) DIAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.000.000,00

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

EXERCICIOS ANTERIORES	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	0,00	0		
	0,00	0		
	19,80	16.143,56		
	72,00	1.668,20		
	36,00	1.217,40		
	54,00	1.868,20		
	148,50	5.145,25		
	237,00	2.281,15		
	0,00	0		
		1.360.633,56		

	211,19	4.875.219,83		
	378,55	3.035.906,00		
	81,85	504.213,57		
	264,00	609.840,00		
	132,00	457.380,00		
	213,70	658.195,00		
	589,80	2.067.517,00		
	156,50	160.256,25		
	194,87	262.932,51		
		12.814.119,85		

	109,00	79.722,00		
	45,50	35.095,00		
	19,00	346.750,00		
	35,64	48.319,36		
	17,00	226.066,00		
	9,00	48.600,00		
	6,00	13.975,50		
	4,00	42.553,60		
	3,00	63.830,40		
	2,00	185.132,36		
	3,00	52.047,00		
	0,00	0,00		
	72,00	2.008.748,60		
	55,00	1.534.461,50		
	71,00	1.638.709,43		
	17,00	1.178.714,00		
	19,00	481.897,00		
	48,00	604.712,00		
	0,00	0,00		

	80,00	238.131,12		
	20,00	96.222,00		
	718,00	1.342.250,4		
	153,00	411.835,8		
	0,00	0		
	0,00	0		
	70,82	1.449.393,28		
		5.986.377,93		

	111,72	1.418.743,664		
	0,00	0		
		24.6743,664		
	23,10	313.089,8		
	22,05	448.843,085		
	19,90	67.451,05		
	9,56	29.145.005,25		
	7,58	450.36.118		
		488.654,0863		

VALOR ACTA 12.823.121,11

COSTO DIRECTOS	11.434.894,75			
COSTO TOTAL	12.458.121,11			

VALOR ACTA 12.823.121,11

PRECIOS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.		CONTRATISTA: NELSON BIDOYA NIT. No 16.256.886		DIA 30	MES 8	AÑO 2016
INTERVENTORA		SUPERVISOR: ARL EDUARDO LORES QUINTERO				
ITEM- ACTIVIDAD - CANTIDAD		ESTUCO SOBRE COLUMNAS		UNIDAD	M	CODIGO ITEM
LOCALIZACIÓN	TOTAL	MATERIALES		VAL. MATERIALES	VAL. TOTAL	
		LONGITUD	CANTIDAD			
SECTOR ORIENTE	36,00	12,00	3,00	\$ 2.310,00	\$ 83.160,0	
SECTOR SUR	36,00	12,00	3,00	\$ 2.310,00	\$ 83.160,0	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
	0,00			\$ 2.310,00	\$ -	
TOTAL	72,00			\$ 2.310,00	\$ 166320,00	
Observaciones:						


 NELSON BIDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARL EDUARDO LORES Q
 SUPERVISOR

JHON ROBERT
 INFTULUA




PRECTAS DE OBRAS					PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.									
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.226.896			DIA	MES	AÑO		
					30	8	2016		
INTERVENTORA		SUPERVISOR: ANGELO LORES QUINTERO							
ITEM- ACTIVIDAD -CAPITULO		PINTURA COLUMNAS			UNIDAD	M2	CODIGO ITEM	1-6	
LOCALIZACIÓN	TOTAL	MATERIALES			M. MANO	M. TOTAL			
		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD					
SECTOR ORIENTE	16,00	12,00	0,50	3,00	\$ 2.310,00	\$ 41.580,0			
SECTOR SUR	18,00	12,00	0,50	3,00	\$ 2.310,00	\$ 41.580,0			
	0,00				\$ 2.310,00	\$ -			
	0,00				\$ 2.310,00	\$ -			
	0,00				\$ 2.310,00	\$ -			
	0,00				\$ 2.310,00	\$ -			
	0,00				\$ 2.310,00	\$ -			
	0,00				\$ 2.310,00	\$ -			
	0,00				\$ 2.310,00	\$ -			
	0,00				\$ 2.310,00	\$ -			
TOTAL	34,00					\$8160,00			
Observaciones									


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


ANG. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

NITULUA

PRECIOS DE OBRAS					PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.									
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA R.T. No 18.205.894			DIA	MES	AÑO		
					30	5	2014		
INTERVENTORA		SUPERVISOR: Aro EDWARD LORES GONTERO							
ITEM- ACTIVIDAD- CAPITULO		ESTUCO SOBRE MUROS			UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	1-6	
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VL. PIEDRA	VL. TOTAL			
		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD					
LOCALES SECTOR SUR LADO SUR	27,00	3,00	1,80	5,00	\$ 3.485,00	\$ 93.555,0			
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO ORIENTE	27,00	3,00	1,80	5,00	\$ 3.485,00	\$ 93.555,0			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
TOTAL	64,00					187110,00			


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES G.
 SUPERVISOR

RPTTULUA

PRECTAS DE OBRAS				PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.							
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA RIT. No 18.288.898		DIA	MES	AÑO	
				30	8	2018	
INTERVENTORA		SUPERVISOR: Arq EDWARD LORES QUINTERO					
ITEM - ACTIVOS - CAPITULO		PINTURA MUROS		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	
				1-7			


LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VL. MENOR	VL. MAYOR	
		LONGITUD	ALTEZA			
LOCALES SECTOR SUR LADO SUR	80,00	20,00	3,00	\$ 3.485,00	\$ 287.900,0	
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO ORIENTE	51,00	17,00	3,00	\$ 3.485,00	\$ 178.715,0	
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO OCCIDENTAL	37,50	25,00	1,50	\$ 3.485,00	\$ 126.937,5	
	0,00			\$ 3.485,00	\$ -	
	0,00			\$ 3.485,00	\$ -	
	0,00			\$ 3.485,00	\$ -	
	0,00			\$ 3.485,00	\$ -	
	0,00			\$ 3.485,00	\$ -	
	0,00			\$ 3.485,00	\$ -	
TOTAL	168,50				\$14582,80	


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

HFTULUA

PRECIOS DE OBRAS					PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.									
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BIDOYA NIT. No 10.205.886			DIA	MES	AÑO		
					30	8	2016		
INTERVENIENTE		CONSORCIO INTERVENIENTES DEL VALLE							
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RASQUETEADA MUROS			UNIDAD	M2	CODIGO ITEM	1-8	
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VL. PARCIAL	VL. TOTAL			
		LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD					
LOCALES SECTOR SUR LADO SUR	80,00	20,00	3,00	1,00	\$ 3.485,00	\$ 207.900,0			
LOCALES SECTOR SUR LADO NORTE	76,00	12,00	0,50	13,00	\$ 3.485,00	\$ 270.270,0			
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO ORIENTE	51,00	17,00	3,00	1,00	\$ 3.485,00	\$ 178.715,0			
LOCALES SECTOR ORIENTE LADO OCCIDENTE	48,00	12,00	0,50	0,00	\$ 3.485,00	\$ 166.320,0			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00				\$ 3.485,00	\$ -			
	0,00								
TOTAL	267,00					821.205,00			



 NELSON BIDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INPTULUA

PRECIOS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 18.266.886		DIA	MES	AÑO
INTERVENTORIA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO		30	8	2018
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		TUBERIA HIDRAULICA PVC 1/2"		UNIDAD	m	CODIGO ITEM
2.1-2						

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DESCRIPCION LONGITUD	VL. PARCIAL	VL. TOTAL	
SECTOR SUR LADO SUR	10,00	10,00	\$ 770,00	\$ 7.700,0	
SECTOR SUR LADO NORTE	6,00	6,00	\$ 770,00	\$ 4.620,0	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
TOTAL	16,00			12320,00	


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA



 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INFTTULUA

PRECIOS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.265.896		DIA	MES	AÑO
				30	8	2016
INTERVENTORIA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		TUBERIA HIDRAULICA PVC 1/2"		UNIDAD	M	CODIGO ITEM
						2.1-2

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES LONGITUD	VRL PARCIAL	VRL TOTAL	
SECTOR SUR LADO SUR	10,00	10,00	\$ 770,00	\$ 7.700,0	
SECTOR SUR LADO NORTE	6,00	6,00	\$ 770,00	\$ 4.620,0	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
	0,00		\$ 770,00	\$ -	
TOTAL	16,00			12.220,00	


Observaciones	
---------------	--


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INFTULUA


PRECIOS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE						
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						DIA	MES	AÑO
		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.255.906				30	8	2016
INTERVENIENTE		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO						
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		REGATA MURO		UNIDAD	m	CODIGO ITEM	2.1-4	
LOCALIZACIÓN	TOTAL	CANTIDADES UNIDAD	VE. PARCIAL	VE. TOTAL				
SECTOR SUR LADO SUR	22,50	22,50	\$ 1.355,80	\$ 30.605,5				
	0,00		\$ 1.355,80	\$ -				
	0,00		\$ 1.355,80	\$ -				
	0,00		\$ 1.355,80	\$ -				
	0,00		\$ 1.355,80	\$ -				
	0,00		\$ 1.355,80	\$ -				
	0,00		\$ 1.355,80	\$ -				
TOTAL	22,50			30605,50				


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

MPTULUA

PRECTAS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 18.286.888		DIA	MES	AÑO
INTERVENTORA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO		30	8	2016
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		TUBERIA SANITARIA 2" - 3"		UNIDAD	M	CODIGO ITEM
LOCALIZACIÓN		TOTAL	SUMINISTROS (MUNICIPIO)	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
SECTOR SUR LADO NOR-OCC		9,00	9,00	\$ 7.700,00	\$ 69.300,0	
		0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
		0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
		0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
		0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
		0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
		0,00		\$ 7.700,00	\$ -	
TOTAL		9,00			69300,00	
Observaciones:						


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

MFTULUA

PRECTAS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.266.696			DIA	MES	AÑO
				30	8	2016
INTERVENTORIA	SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO					
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	TUBERIA SANITARIA 4"-6"			UNIDAD	ml	CODIGO ITEM
						2.1-7

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DESCRIPCION LONGITUD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
SECTOR SUR LADO NOR-OCC	6,00	6,00	\$ 2.329,25	\$ 13.975,5	
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -	
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -	
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -	
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -	
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -	
	0,00		\$ 2.329,25	\$ -	
TOTAL	6,00			13975,50	


Observaciones:


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

MFTULUA


PRECTAS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 18.386.896			DIA	MESES
				30	8
INTERVENTORA	SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO				AÑO 2016
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		PUNTO SANITARIO 2°		UNIDAD	pto
					CODIGO ITEM
					2.1-8
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DESCRIPCIONES UNIDAD	VL. PARCIAL	VL. TOTAL	
SECTOR SUR LOCALES LADO OCC	5,00	5,00	\$ 10.638,40	\$ 53.192,0	
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -	
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -	
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -	
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -	
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -	
	0,00		\$ 10.638,40	\$ -	
TOTAL	5,00			63192,00	


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INFTULUA


PRECTAS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 18.268.896		DIA	MES	AÑO
INTERVENTORIA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO		30	8	2018
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RED ELECTRICA PRINCIPAL ENT		UNIDAD	m/	CODIGO ITEM 2-2-1
LOCALIZACIÓN	TOTAL	CANTIDAD LONGITUD	VL. PARCIAL	VL. TOTAL		
SECTOR CENTRAL	129,00	129,00	\$ 5.579,86	\$ 719.801,9		
	0,00		\$ 5.579,86	\$ -		
	0,00		\$ 5.579,86	\$ -		
	0,00		\$ 5.579,86	\$ -		
	0,00		\$ 5.579,86	\$ -		
	0,00		\$ 5.579,86	\$ -		
	0,00		\$ 5.579,86	\$ -		
	0,00		\$ 5.579,86	\$ -		
TOTAL	129,00			719801,94		
Observaciones						


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INFTULUA


PRECTAS DE OBRAS			PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.266.886		DIA	MES	AÑO
				30	8	2016
INTERVENTORA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		PUNTO ELECTRICO TOMAS		UNIDAD	pto	CODIGO ITEM
LOCALIZACIÓN	TOTAL	EDIFICACION Punto	VAL. PARCIAL	VAL. TOTAL		
SECTOR NORTE LADO NORTE	10,00	10,00	\$ 27.889,30	\$ 278.993,0		
SECTOR NORTE LADO SUR	8,00	8,00	\$ 27.889,30	\$ 167.395,8		
	0,00		\$ 27.889,30	\$ -		
	0,00		\$ 27.889,30	\$ -		
	0,00		\$ 27.889,30	\$ -		
	0,00		\$ 27.889,30	\$ -		
	0,00		\$ 27.889,30	\$ -		
	0,00		\$ 27.889,30	\$ -		
	0,00		\$ 27.889,30	\$ -		
	0,00		\$ 27.889,30	\$ -		
TOTAL	18,00			446.388,80		
Observaciones						


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


ARQ. EDWARD LORES Q.
 SUPERVISOR

INFI TULUA


PRECTAS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE			
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.					
CONTRATISTA	CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 15.286.688		DIA	MES	AÑO
			30	E	2016
INTERVENTORIA	SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR		UNIDAD	pto
				codigo ITEM	2,24
LOCALIZACIÓN	TOTAL	ORDENACIONES LINEAS	VL. PARCIAL	VL. TOTAL	
SECTOR NORTE LADO NORTE	10,00	10,00	\$ 27.899,30	\$ 278.993,0	
SECTOR NORTE LADO SUR	8,00	8,00	\$ 27.899,30	\$ 167.395,8	
	0,00		\$ 27.899,30	\$ -	
	0,00		\$ 27.899,30	\$ -	
	0,00		\$ 27.899,30	\$ -	
	0,00		\$ 27.899,30	\$ -	
	0,00		\$ 27.899,30	\$ -	
TOTAL	18,00			446398,80	


NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INFTULUA

PRECTAS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA MT. No 16.265.886		DIA	MES	AÑO
INTERVENTORIA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO		30	8	2018
ITEMS - ACTIVIDAD - CAPITULO		BREAKERS		UNIDAD	Und	CODIGO ITEM
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DESCRIPCIONES PUNTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL		
SECTOR NORTE LADO OCCIDENTAL	4,00	4,00	\$ 12.881,50	\$ 50.726,0		
	0,00		\$ 12.881,50	-		
	0,00		\$ 12.881,50	-		
	0,00		\$ 12.881,50	-		
	0,00		\$ 12.881,50	-		
	0,00		\$ 12.881,50	-		
TOTAL	4,00			50726,00		
Observaciones						


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INFITULUA

PRECTAS DE OBRAS REMDELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.	PABELLON DE CARNES TULUA VALLE
--	---

CONTRATISTA	CONTRATISTA: NERSON BEDOYA NIT. No 18.258.888	DIA	MES	AÑO
		30	8	2014
INTERVENTORIA	SUPERVISOR: Arg. EDWARD LORES QUINTERO			

ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA	UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	3-1
-----------------------------	-------------------------------------	--------	----	-------------	-----

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
		LARGO	ANCHO			
SECTOR SUR	80,00	10,00	8,00	\$ 29.891,40	\$ 2.391.312,0	
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00			\$ 29.891,40	\$ -	
TOTAL	80,00				2391312,00	

--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRECTAS DE OBRAS REMDELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.	PABELLON DE CARNES TULUA VALLE
--	---

CONTRATISTA	CONTRATISTA: MESON BEDOYA NIT. No 16.256.886	DIA	MES	AÑO
		30	8	2016
INTERVENTORIA	SUPERVISOR: Arq.EDWARD LORES GUNTERO			

ITEM - ACTIVIDAD - CONTROL	IMPERMEABILIZACION CANAL FACHADA CRA 22	UNIDAD	ML	CODIGO ITEM	3-2
-----------------------------------	--	---------------	-----------	--------------------	-----

LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VL. PARCIAL	VL. TOTAL										
		LARGO	CANTIDAD												
SECTOR ORIENTE	20,00	20,00	1,00	\$ 18.116,00	\$ 362.320,0										
	0,00			\$ 18.116,00	\$ -										
	0,00			\$ 18.116,00	\$ -										
	0,00			\$ 18.116,00	\$ -										
	0,00			\$ 18.116,00	\$ -										
	0,00			\$ 18.116,00	\$ -										
	0,00			\$ 18.116,00	\$ -										
	0,00			\$ 18.116,00	\$ -										
	0,00			\$ 18.116,00	\$ -										
TOTAL	20,00				362320,00										

Observaciones

Handwritten signature

Handwritten signature

PRECIOS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA MT. No 16.255.886		DIA 30	MES 8	AÑO 2016
INTERVENTORIA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		CAMBIO CAÑA BRAVA		UNIDAD	m2	CODIGO ITEM
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES		VL. PARCEL.	VL. TOTAL	
		LONGITUD	ANCHO			
SECTOR SUR	146,00	20,00	7,30	\$ 6.340,00	\$ 925.727,5	
SECTOR ORIENTE	72,00	12,00	6,00	\$ 6.340,00	\$ 456.523,2	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
	0,00			\$ 6.340,00	\$ -	
TOTAL	218,00				1382250,70	


Nelson Bedoya


NELSON BEDOYA
CONTRATISTA DE OBRA

Edo
ARQ. EDWARD LORES Q
SUPERVISOR

INFITULUA

PRETAS DE OBRAS					PABELLON DE CARNES TULUA VALLE		
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.							
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.256.895			DIA	MES	ARO
					30	1	2016
INTERVENTORA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES GARCERAN					
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		PISO CONCRETO			UNIDAD	M2	CODIGO ITEM
							4-1
LOCALIZACIÓN	TOTAL	DIMENSIONES			VL. PARCIAL	VL. TOTAL	
		LARGO	ANCHO	CANT.			
SECTOR SUR CORREDOR CENTRAL	75,00	30,00	2,50	1,00	\$ 29.891,40	\$ 2.241.855,0	
SECTOR SUR LADO SUR	14,40	6,00	2,40	1,00	\$ 29.891,40	\$ 430.436,2	
SECTOR SUR LADO NORTE	22,32	9,30	2,40	1,00	\$ 29.891,40	\$ 667.176,0	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
	0,00				\$ 29.891,40	\$ -	
TOTAL	111,72					3338467,21	
Observaciones							


NELSON BEDOYA
CONTRATISTA DE OBRA


ARQ. EDWARD LORES G
SUPERVISOR

INFITULUA


PRECIOS DE OBRAS					PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.									
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 19.256.995			DIA	MES	AÑO		
					30	8	2016		
INTERVENTORA		SUPERVISOR: Arc. EDUARDO LORES QUINTERO							
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		DEMOLICION MESONES Y POZUELO			UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	S-1	
LOCALIZACIÓN	TOTAL	CONCRETOS			MR. PISOES	MR. TUBOS			
		LONGETUD	ANCHO	CANTIDAD					
SECTOR SUR LADO OCCIDENTAL	23.10	11.00	0.70	3.00	\$ 13.558,00	\$ 313.180,0			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
	0.00				\$ 13.558,00	\$ -			
TOTAL	23,10				\$ 13.558,00	\$ 313.180,00			



 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARC. EDUARDO LORES Q
 SUPERVISOR

INTULUA

PRECIOS DE OBRAS					PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.									
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 16.204.888			DIA	MES	AÑO		
					30	8	2019		
INTERVENIENTE		SUPERVISOR: Arq EDWARD LORES QUINTANA							
ITEM - ACTIVIDAD - CANTIDAD		DEMOLICION PISO			UNIDAD	m2	CODIGO ITEM	5-2	
DESCRIPCIÓN	MORL	RESUMEN			VAL. PARCIAL	VAL. TOTAL			
		LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD					
SECTOR SUR LADO OCCIDENTAL	22,05	3,00	2,45	3,00	\$ 2.033,70	\$ 44.843,1			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
	0,00				\$ 2.033,70	\$ -			
TOTAL	22,05					44843,09			



 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INITULUA

PRECIOS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 98.288.888		DIA	MES	AÑO
INTERVENIENTE		SUPERVISOR: Arq. EDUARDO LORES QUINTERO		20	8	2018
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		DEMOLICION CONTRAPISO		UNIDAD	m	CODIGO ITEM
LOCALIZACIÓN	TOTAL	MANTENIMIENTO LONGITUD	VAL. PRINCIPAL	VAL. TOTAL		
SECTOR SUR LADO NOROCCIDENTAL	19,90	19,90	\$ 3.388,00	\$ 67.461,1		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
	0,00		\$ 3.388,00	\$ -		
TOTAL	19,90			67.461,00		


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDUARDO LORES Q
 SUPERVISOR

JAFITULUA

PRECIOS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE						
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.								
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 10.255.896				DIA	MES	AÑO
						30	8	2016
INTERVENTORIA		SUPERVISOR: Arq. EDWARD LORES QUINTERO						
ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO		RETIRO DE ESCOMBROS			UNIDAD	m3	CODIGO ITEM	5-4
LOCALIZACIÓN	TOTAL	ESCOMBROS			VE. PARCIAL	VE. TOTAL		
		LONGITUD	ANCHO	ALTO				
SECTOR SUR - OCCIDENTE MESONES	2,52	30,00	0,70	0,12	\$ 3.050,55	\$ 7.687,4		
SECTOR SUR - OCCIDENTE PISO	3,09	9,00	2,45	0,14	\$ 3.050,55	\$ 9.426,2		
SECTOR SUR - OCCIDENTE CONTRAPISO	0,84	19,90	0,30	0,14	\$ 3.050,55	\$ 2.562,5		
EXCAVACION RED SANITARIA	0,90	15,00	0,30	0,20	\$ 3.050,55	\$ 2.745,5		
	0,00				\$ 3.050,55	\$ -		
	7,35				\$ 3.050,55			
PORCENTAJE DE EXPANSION 30%	2,21				\$ 3.050,55			
	0,00				\$ 3.050,55	\$ -		
TOTAL	9,56					23621,54		
Observaciones								


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INFITULUA

PRETAS DE OBRAS		PABELLON DE CARNES TULUA VALLE				
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. Para la realización de la obra el contratista suministra mano de obra y equipos.						
CONTRATISTA		CONTRATISTA: NELSON BEDOYA NIT. No 18.255.884		DIA	MES	AÑO
				30	E	2016
INTERVENTORA		SUPERVISOR: ARQ. EDWARD LORES QUINTERO				
ITEM - ACTIVIDAD - CANTIDAD		RELLENO MATERIAL DE SITIO		UNIDAD	m3	CODIGO ITEM
LOCALIZACIÓN	TOTAL	Dimensiones			VAL. PARCIAL	VAL. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
SECTOR SUR -OCCIDENTE PISO	3,00	9,00	2,45	0,14	\$ 3.050,55	\$ 9.426,2
SECTOR SUR -OCCIDENTE CONTRAPISO	1,49	19,90	0,30	0,25	\$ 3.050,55	\$ 4.545,3
EXCAVACION RED SANITARIA	2,80	28,00	0,40	0,25	\$ 3.050,55	\$ 8.541,5
	0,00				\$ 3.050,55	\$ -
	0,00				\$ 3.050,55	\$ -
	0,00				\$ 3.050,55	\$ -
	0,00				\$ 3.050,55	\$ -
	0,00				\$ 3.050,55	\$ -
TOTAL	7,38					22543,06


 NELSON BEDOYA
 CONTRATISTA DE OBRA


 ARQ. EDWARD LORES Q
 SUPERVISOR

INFITULUA
