


	INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS		
Código: F-402-03	Versión: 02	Fecha de aprob: 31/MAR/2010	Página: 1 de 2

No. CONTRATO	400-16-1.081	PERIODO DE RENDICIÓN	1 DE OCTUBRE	A	31 DE OCTUBRE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE HUMBERTO ZAMBRANO TOLE				
INTERVENTOR	DIANA LORENA VIVEROS CORTES				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFÍA EN OBRAS QUE DESARROLLE INIFITULUA E.I.C.E				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES			
1. Construcción de levantamientos topográficos de los proyectos urbanos que realice el Instituto. 2. Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 3. Calcular los volúmenes de tierra.	1. levantamiento topográfico del proyecto plan parcial 5, Diagonal 23, calle 26 detrás del terminal. 2. Se nivelaron 604.30 metros del proyecto pavimentos comunitarios, dejando demarcado en campo los niveles para excavación y chequeo de sub base y terminado. 3. Calcular volúmenes de tierra mediante la topografía para los diferentes proyectos que realice la institución.	1. se da apoyo en el área de topografía en el levantamiento del lote PP5 con curvas de nivel para el terminal de transporte, y diagonal 23 y calle 26 para pendientes de pavimento. 2. se brindo apoyo al proyecto de pavimentos comunitarios nivelando las calles prioritarias como son: San Benito, nuevo morales, Panamericano, Lomitas chequeando niveles de excavación. 3. se elaboro el cálculo de volúmenes excavados en las calles de santa cruz, veraneras y limonar para el proyecto de pavimentos comunitarios y calculo de volumen por el método de comparación de superficie para el volumen de excavación del descapote en lote terminal PP5.			

		INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02	Fecha de aprob: 31/MAR/2010	Página: 2 de 2

4. Elaboración de perfiles y planos topográficos.		4. se elaboraron planos topográficos para el terreno natural PP5 y calle 26 detrás del terminal.		4. Elaboración de los planos topográficos del terreno existente del lote del plan parcial 5 y calle 26 detrás del terminal con paramentos.	
				% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	4	28	72	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	4			
IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos o negativos)					
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)		1. Anexo fotos y datos de levantamiento. 2. Anexo cartera de campo y fotos. 3. Cartera y reporte de volúmenes. 4. Fotos, datos e imagen de planos.			

FIRMA.


JORGE H. ZAMBRANO TOLE
C.C. 1.112.100.656

Simple

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2016-10-26 03:43:52 PM Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: octubre de 2016

Período Servicio: octubre de 2016

RECIBO SERVICIOS PUBLICOS
CONCEPTO: PAGO DE SIMPLE
RECIBO: 8865991030
VALOR: 322000
FECHA: 20161026
PERIODO: 201610

Número Planilla: 8800193870

Referencia pago (PIN): 8865991030

GUARDADA 29/09/2016

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE HUMBERTO ZAMBRANO TOLE	Dirección	CL 10 N 4-79 B / ANDALUCIA
Documento	CC1112100656	Teléfono	3137580538
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Total Afiliados	1
Ciudad	TULUA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	ZAMBRANO TOLE JORGE HUMBERTO	Identificación	CC1112100656

IMPORTANTE: Señor aportante si usted realiza el pago de su aporte después de las 4:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago. SIMPLE S.A. da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novidades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Tot	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Tot		
112100656	ZAMBRANO TOLE JORGE HUMBERTO	1	0																												

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSB	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licencias, Salidas	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FSB
\$ 1.028.000	\$ 1.028.000	\$ 1.028.000	\$ 0	\$ 160.500	\$ 0	\$ 0	\$ 128.500	\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.000	\$ 4.000	\$ 32

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora		Período de cotización salud											
8		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadogruerías Cafam-Colsubsidio-



888865991030000000091231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-



(415)7709998485864(8020)8865991030(3900)0000000(96)20991231

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


¡El Poder de lo SIMPLE!


1. Anexo fotos y datos de levantamiento.

CALLE 26




DIAGONAL 23

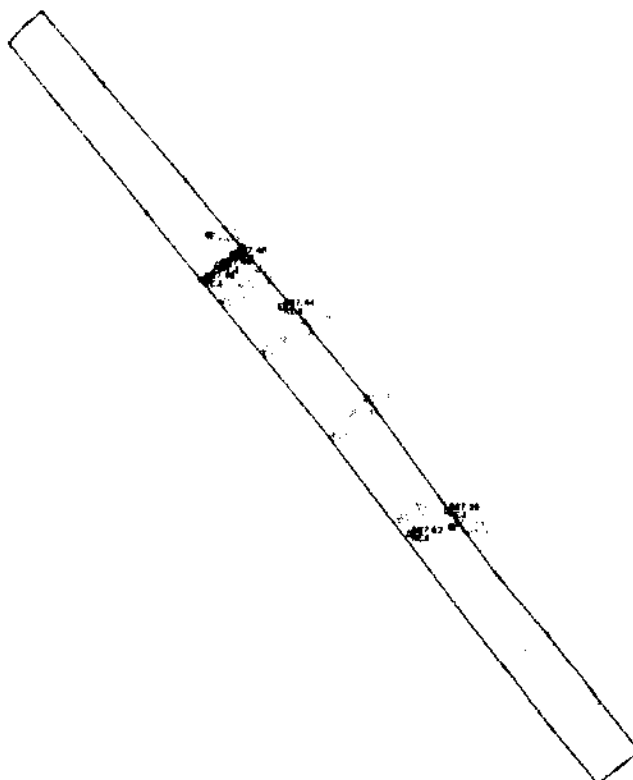

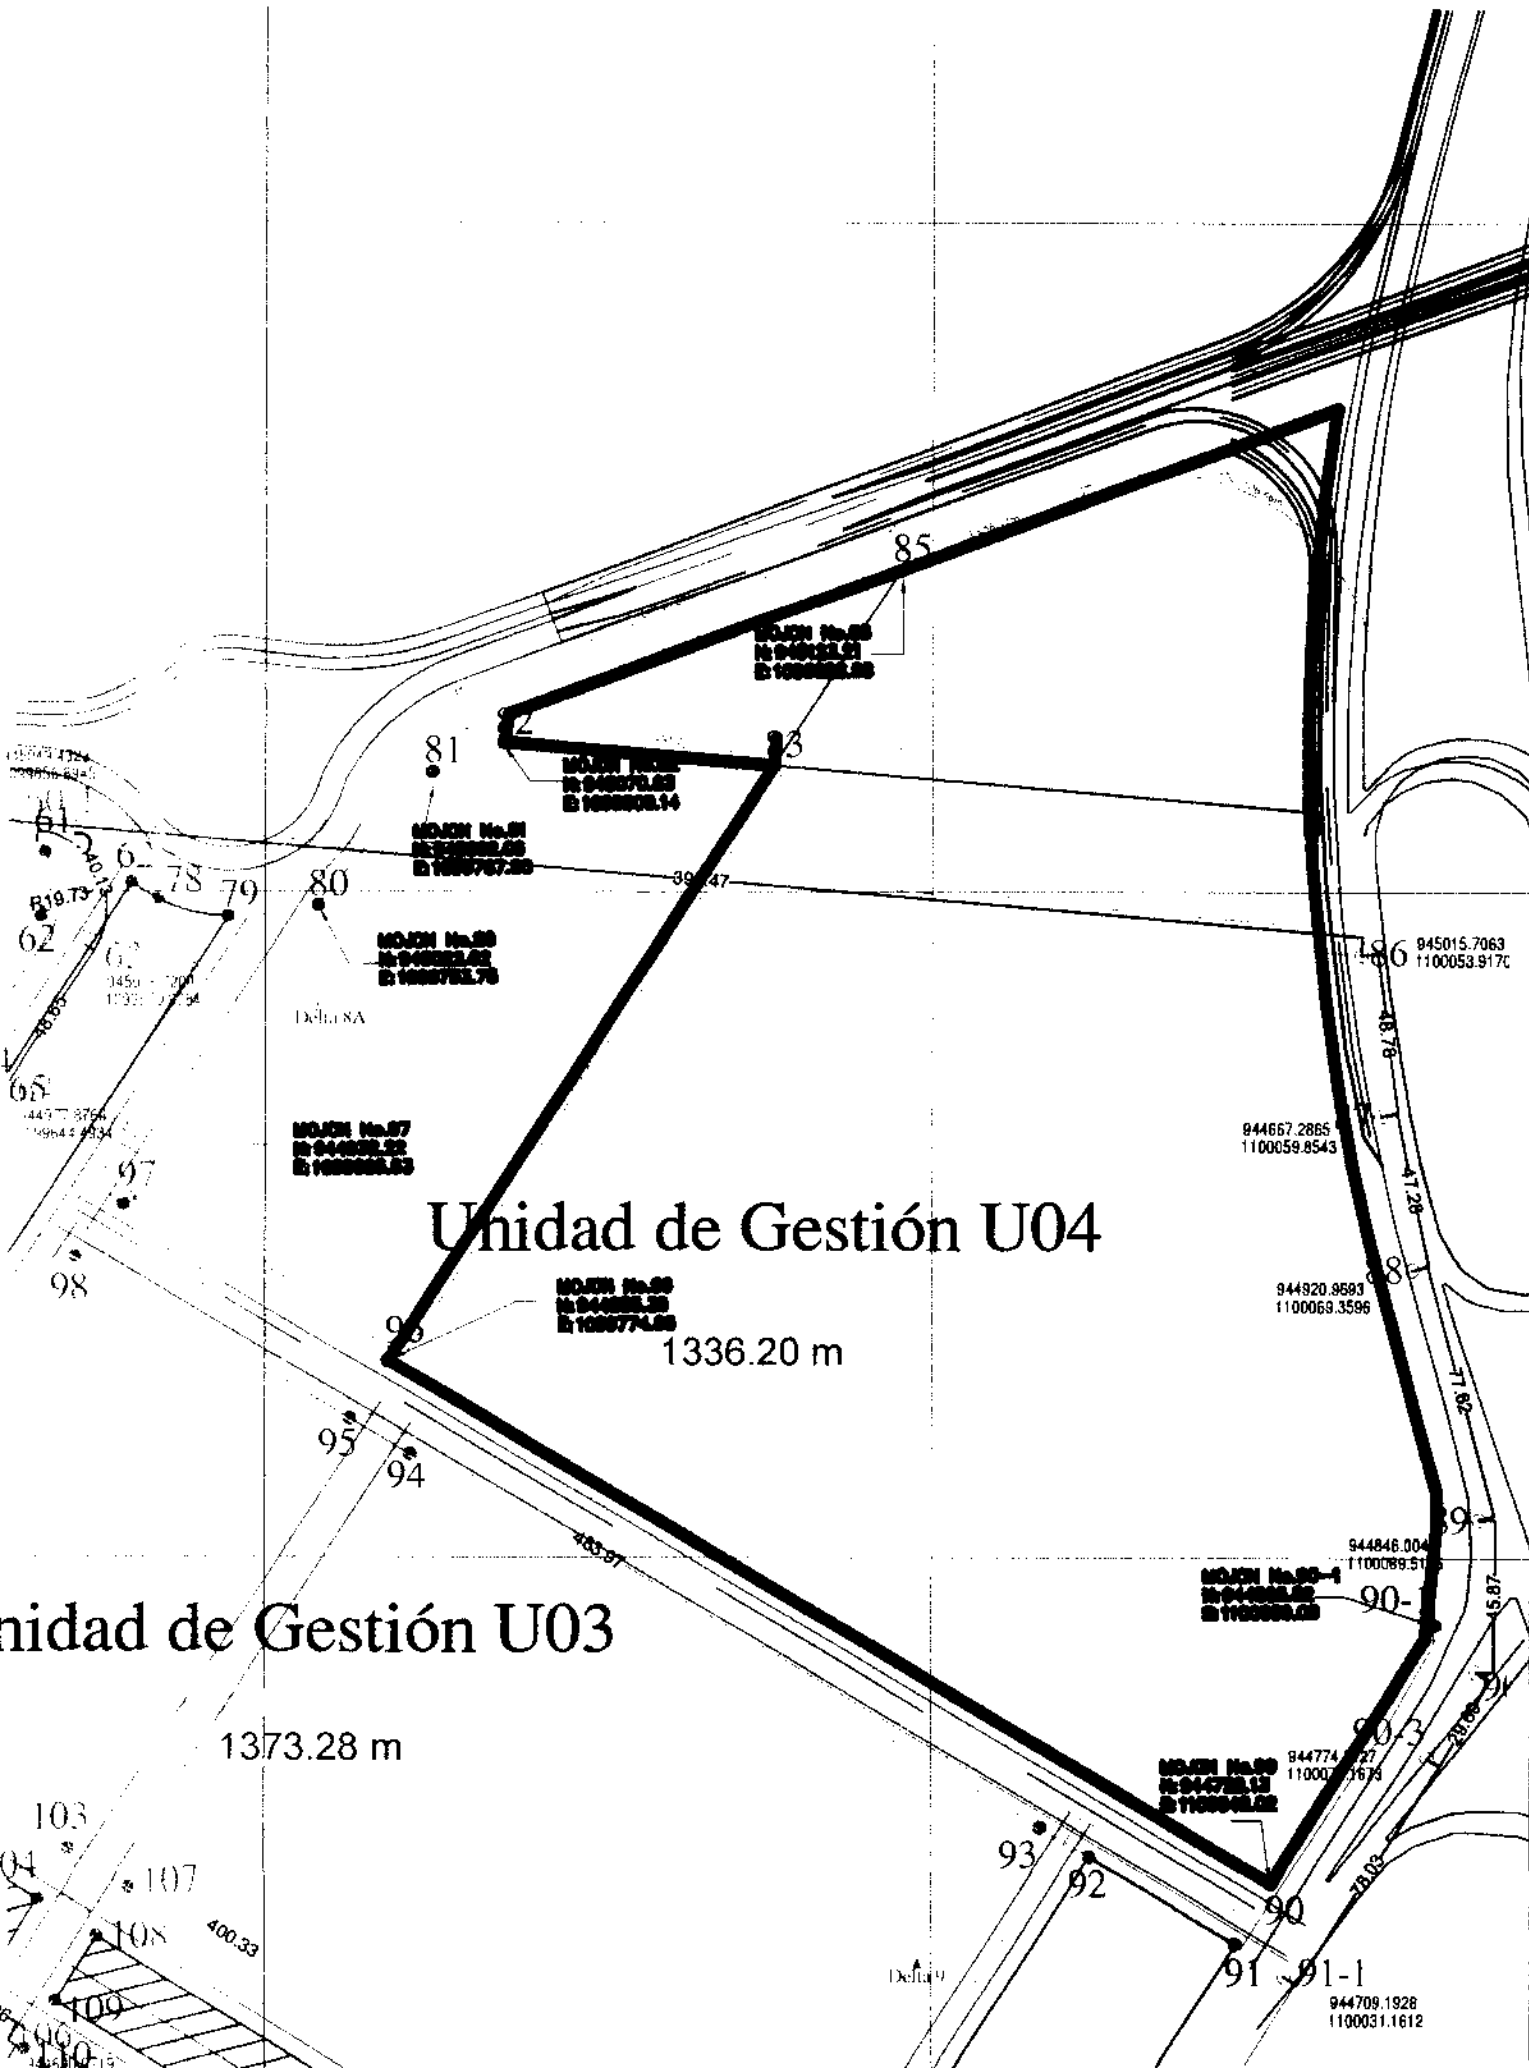

2. Anexo cartera de campo y fotos.

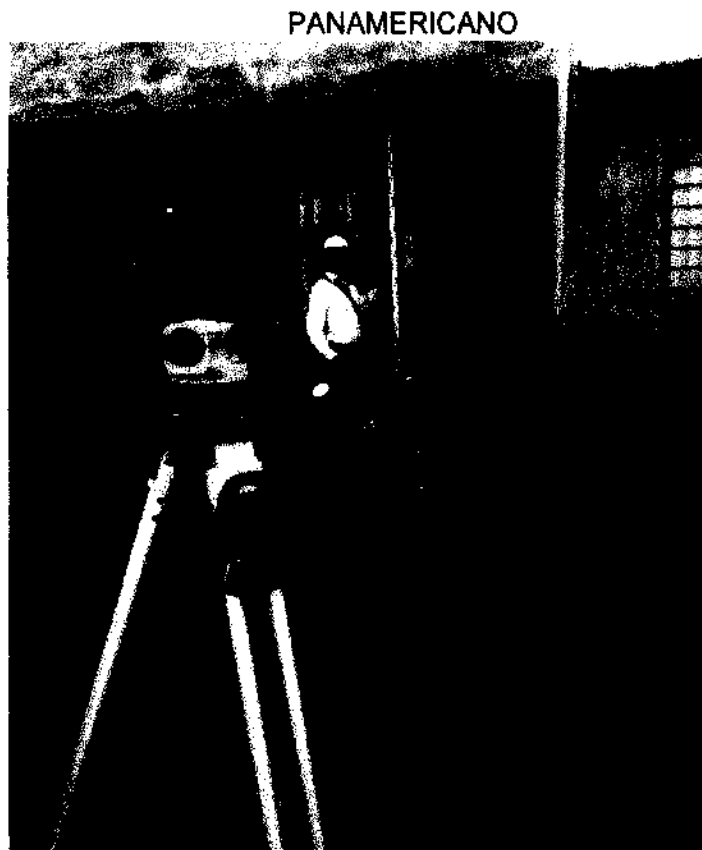

TRAMO Calle 29B entre carreras 43 y 45 **SAN BENITO**

DISTANCIA 30 **DESNIVEL** -0.660 **CADA 10m** -0.22 **1**

BM	COTAS					
	V-	V+	VI	TN	PROYECTO	NIVELETA
BM				100		
Al		2.1		102.10		
PAVIMENTO			2.1	100.00		
k0+00			2.1	100.00	100.00	101.00
k0+010			1.88	100.22	100.05	101.05
k0+020			1.72	100.38	100.10	101.10
k0+030			1.65	100.45	100.15	101.15
k0+040			1.72	100.38	100.20	101.20
k0+050			1.63	100.47	100.25	101.25
k0+060			1.62	100.48	100.30	101.30
k0+070			1.59	100.51	100.35	101.35
k0+080			1.44	100.66	100.40	101.40
k0+090			1.4	100.70	100.45	101.45
k0+100			1.54	100.56	100.50	101.50
k0+110			1.38	100.72	100.55	101.55
k0+120			1.4	100.70	100.60	101.60
TERRENO	1.44			100.66		

TRAMO

Calle 30A entre carrera 38 y 43

PANAMERICANO

DISTANCIA

30

DESNIVEL

-1.120

CADA 10m

-0.37

1

				COTAS		
BM	V-	V+	VI	TN	PROYECTO	NIVELETA
BM				100		
AI		2.44		102.44		
PAVIMENTO 1			2.44	100.00		
k0+00			2.44	100.00	100.00	101.00
k0+010			2.07	100.37	100.10	101.10
k0+020			2.01	100.43	100.20	101.20
k0+030			1.93	100.51	100.30	101.30
k0+040			1.79	100.65	100.40	101.40
k0+050			1.73	100.71	100.50	101.50
k0+060			1.62	100.82	100.60	101.60
k0+070			1.48	100.96	100.70	101.70
k0+080			1.47	100.97	100.80	101.80
CAMARA 2	1.32			101.12		

NUEVO MORALES



3. Cartera y reporte de volúmenes.

TRAMO CALLE 14 ENTRE KRA 49 Y 50

10

DISTANCIA 74.2 DESNIVEL -1.990 CADA 10m -0.27 1 ANCHO EXC

5

				COTAS				
BM	V-	V+	VI	TN	PROYECTO	NIVELETA	EXCAVACION	VOL. EXC
BM				100.27				
AI		2.786		103.06				
PAVIMENTO			2.942	100.11				
k0+00			2.942	100.11	100.11	101.11	99.46	32.7
k0+010			2.743	100.31	100.30	101.30	99.67	32.15
k0+020			2.495	100.56	100.49	101.49	99.77	39.55
k0+030			2.322	100.73	100.68	101.68	99.93	40.2
k0+040			2.035	101.02	100.99	101.99	100.34	34.05
k0+050			1.458	101.60	101.77	102.77	101.17	21.4
k0+060			1.216	101.84	101.84	102.84	101.23	30.5
k0+070			1.072	101.98	102.04	103.04	101.44	27.2
CAMARA	0.952			102.10				
TOTAL EXCAVACION m³							257.75	

TRAMO CALLE 18 ENTRE KRA 1A Y 2A

LIMONAR

10

DISTANCIA 100 DESNIVEL 0.860 CADA 10m 0.09 1 ANCHO EXC

5

				COTAS				
BM	V-	V+	VI	TN	PROYECTO	NIVELETA	EXCAVACION	VOL. EXC
BM				100				
AI		1.38		101.38				
CAMARA1			2.24	99.14				
k0+00			2.24	99.14	99.14			
k0+010			2.11	99.27	99.22	100.22	98.59	34
k0+020			1.99	99.39	99.31	100.31	98.69	35
k0+030			1.93	99.45	99.40	100.40	98.77	34
k0+040			1.83	99.55	99.48	100.48	98.87	34
k0+050			1.75	99.63	99.57	100.57	98.97	33
k0+060			1.67	99.71	99.65	100.65	99.06	32.5
k0+070			1.59	99.79	99.74	100.74	99.12	33.5
k0+080			1.53	99.85	99.83	100.83	99.19	33
k0+090			1.44	99.94	99.91	100.91	99.24	35
k0+100			1.98	99.40	99.99	100.99	99.36	2
CAMARA 2	1.38			100.00				
TOTAL EXCAVACION m³							272	

REPORTE VOLUMEN DE EXCAVACION EN DESCAPOTE LOTE TERMINAL

Cut/Fill Report

Generated: 2016-10-20 11:50:01
By user: Sony
Drawing: D:\INFITULUA\LEVANTAMIENTOS\LOTE TERMINAL\DWG\D:\INFITULUA\LEVANTAMIENTOS\LOTE TERMINAL\DWG\LOTE TERMINAL JZ.dwg


Volume Summary							
Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
VOL-EXCV-DESCAPOTE	fill	1.000	1.000	52096.39	26056.41	0.00	26056.41<Cut>

Totals				
	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total	52096.39	26056.41	0.00	26056.41<Cut>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

4. Fotos, datos e imagen de planos.

CALLE 26 DETRÁS DEL TERMINAL

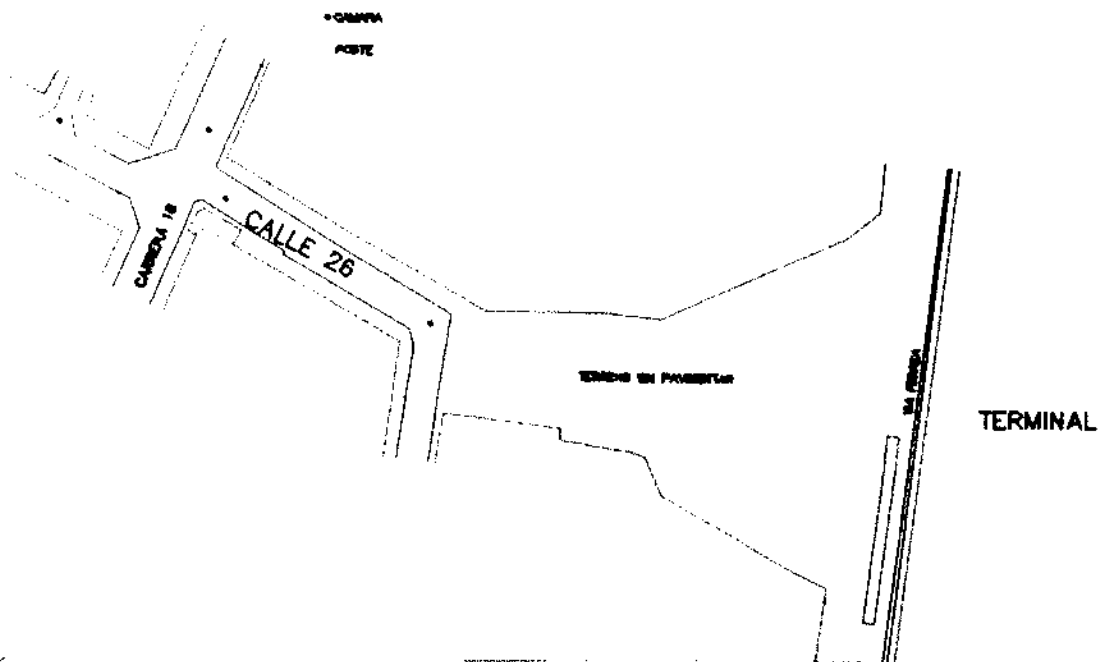

DATOS LEVANTAMIENTO CALLE 26 DETRÁS DEL TERMINAL

POINTS	East	North	Elevation	Code
10	1095409.67	944189.664	960.190568	1
11	1095413.66	944187.348	960.22646	1
12	1095426.31	944180.091	960.073599	2
13	1095426.71	944180.923	960.093027	2
14	1095409.27	944191.509	960.058883	2
15	1095407.4	944191.029	960.104904	2
16	1095409.64	944185.726	960.29091	1
17	1095408.31	944184.874	960.280834	1
18	1095417.42	944185.159	960.441689	1
19	1095408.03	944188.979	960.207879	1
20	1095406.21	944184.809	960.257748	1
21	1095404.29	944179.588	960.268096	3
22	1095404.57	944176.161	960.257278	1
23	1095401.49	944177.422	960.222609	2
24	1095392.53	944178.361	960.232559	2
25	1095395.69	944185.697	960.14264	2
26	1095393.74	944191.767	960.04568	2
27	1095391.06	944192.871	960.114517	3
28	1095378.54	944199.275	959.982945	3
29	1095376.65	944200.695	959.829947	2
30	1095376.92	944192.885	960.320775	1
31	1095391.81	944184.898	960.322117	1
32	1095389.46	944179.305	960.312463	1

33	1095388.54	944174.433	960.263491	3
34	1095381.95	944205.031	959.834992	2
35	1095381.16	944208.964	959.780051	2
36	1095381.75	944210.437	959.778333	2
37	1095378.32	944212.402	959.741552	2
38	1095377.67	944210.9	959.741827	2
39	1095374.3	944208.846	959.720371	2
40	1095369.2	944211.556	959.700806	2
41	1095375.41	944213.7	959.859149	1
42	1095376.85	944212.072	959.783219	3
43	1095378.59	944208.171	959.797579	7
44	1095384.41	944208.974	960.366484	1
45	1095389.64	944202.057	960.100762	3
46	1095393.19	944199.047	959.965828	2
47	1095397.96	944202.111	960.37778	1
48	1095400.14	944207.146	960.372157	1
49	1095405.48	944206.689	960.060281	2
50	1095403.5	944202.215	960.05873	2
51	1095410.48	944206.22	960.009058	7
52	1095417.93	944208.366	959.968389	1
53	1095421.84	944220.043	959.76987	3
54	1095418.31	944212.85	959.754631	2
55	1095416.45	944205.044	960.036351	2
56	1095414.3	944200.299	960.192405	1
57	1095411.88	944198.306	960.063888	2
58	1095420.95	944192.688	960.059502	2
59	1095414.26	944191.735	960.035351	7
60	1095438.99	944186.104	960.266011	1
61	1095443.76	944178.748	960.131427	2
62	1095469.86	944168.168	960.418928	1
63	1095462.56	944167.234	960.23058	2
64	1095458.08	944165.286	960.140198	7
65	1095451.46	944161.614	960.295593	1
3	1095460.69	944161.362	960.145583	DELTA
66	1095453.83	944164.179	960.120897	2
67	1095454.28	944161.277	960.143284	2
68	1095454.19	944158.614	960.146675	2
69	1095452.49	944149.025	960.324161	3
70	1095452.29	944145.539	960.207687	2
71	1095449.29	944145.501	960.445404	1
72	1095458.18	944138.728	960.260626	2
73	1095459.23	944135.035	960.353244	1
74	1095460.75	944145.549	960.373082	1
75	1095459.41	944144.849	960.385629	3
76	1095459.86	944150.507	960.179115	2
77	1095486.13	944142.535	960.392539	1

PLANO SUPERFICIE LOTE PLAN PARCIAL 5

